30FRANK

Bordereau de paiement - 12 décembre 24

Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT	TVA	Montant TTC	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
2024-2352	SMART DESIGN	12/12/2024	12 646,92	1 264,69	13 911,61	5%	100%

13 911,61

Bon à payer

ROM
ROUX ŒUVRE MAITRISE
110 Boulevard Jean Jaurès
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
SAS au capital de 15.000€
RCS Nanterre B 408 566 701
APE 7112B – SIRET 408 566 701 000 53

30FRANK

Tableau récapitulatif du projet - 12 décembre 24

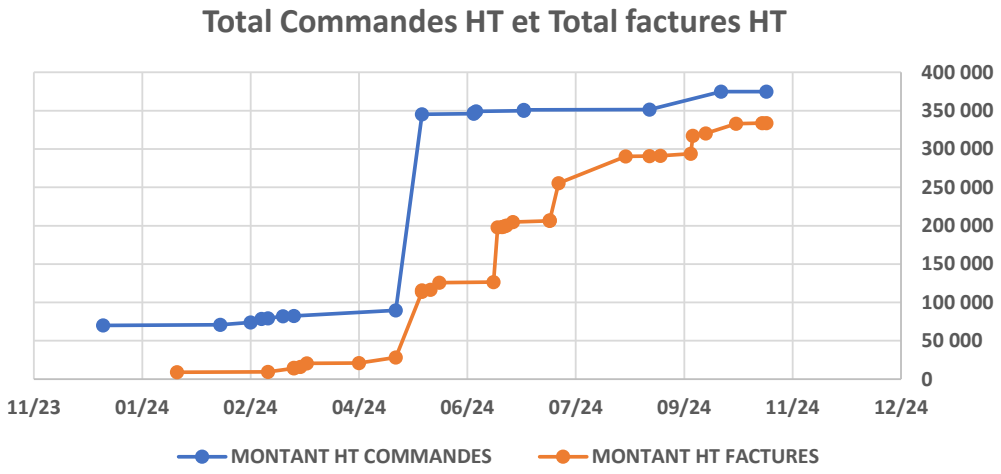

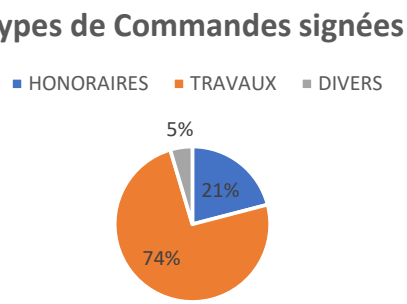

Récapitulatif des dépenses du projet	
Nombre total de commandes	**17**
Nombre total d'avenants	**5**
Nombre de commandes actives	**12**
Nombre total factures	**30**
Montant total commandes (HT)	**374 764,28**
Montant total factures (HT)	**333 784,28**
Total commandes honoraires (HT)	**78 500,00**
Total commandes travaux (HT)	**278 990,21**
Total commandes divers (HT)	**17 274,07**
Total TVA Commandes	**39 051,52**
Total TVA factures	**34 426,02**
Nombre de factures avec retenue	**4**
Montant total retenue de garantie (HT)	**0,00**
Montant total commandes (TTC)	**413 815,80**
Montant total factures (TTC)	**368 210,30**

Progression du paiement	
% D'avancement - 12 décembre 24	**3%**
% D'avancement total	**89%**

Bordereau de transmission

30FRANK

Tableau récapitulatif des commandes - 12 décembre 24

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	**Montant HT**	**% D'avancement**	**Société**	**Montant HT**	**% D'avancement**	**Société**	**Montant HT**	**% D'avancement**
ROM	70 000,00	43%	SMART DESIGN	278 990,21	100%	MS CONSEILS	5 450,00	100%
RISK CONTROL	4 700,00	100%				Cabinet de Contrôle	600,00	100%
LS CONSEILS	3 200,00	96%				PLASSE	7 159,07	100%
AB Structures	600,00	100%				LS CONSEILS	995,00	92%
						LS CONSEILS	980,00	0%
						LS CONSEILS	2 090,00	93%
						LS CONSEILS	0,00	100%

30FRANK

Budget - 12 décembre 24

			Qt	Total HT	TVA	Total TTC	Commandes HT	Commandes
Commun aux deux phases	Installations de chantiers & logistique							
		Coût	0,04	34 000,00	0,00	34 000,00	cis	8 11
		Frais de voirie	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	cis	8 11
		Base vie	cis	cis			cis	8 11
	Démolition & Dépollution							
		Curage des appartements	290,00	21 750,00	2 175,00	23 925,00	cis	8 11
		Budget dépollution	1,00	15 000,00	1 500,00	16 500,00	cis	8 11
Sous-total commun				**85 750,00**	**3 675,00**	**89 425,00**	**cis**	**8 11**
Phase 1	Structure & GO							
		Ouverture de l'entrée vers la salle à manger	1,00	5 000,00	500,00	5 500,00	cis	8 11
		Trémie salon	18,58	11 145,66	1 114,57	12 260,23	cis	8 11
		Traitement du nez de dalle trémie	16,83	5 049,00	504,90	5 553,90	cis	8 11
		Trémie escalier	5,00	3 000,00	300,00	3 300,00	cis	8 11
		Traitement du nez de dalle trémie	11,00	3 300,00	330,00	3 630,00	cis	8 11
		Ouverture voile R+6	1,00	3 000,00	300,00	3 300,00	cis	8 11
	Toitures							
		Créations de lucarnes 80 x 100	8,00	30 000,00	3 000,00	33 000,00	cis	8 11
		Reprises d'étanchéités toiture	25,00	12 500,00	1 250,00	13 750,00	cis	8 11
	Façades							
		Changement des fenêtres et traitement des appuis R+5	11,00	77 000,00	7 700,00	84 700,00	cis	8 11
		Changement des fenêtres R+6	3,00	7 500,00	750,00	8 250,00	cis	8 11
Sous-total phase 1				**157 494,66**	**15 749,47**	**173 244,13**	**278 990,21**	
Phase 2	CEA hors salles d'eaux							
		Rénovation des sols - parquet	270,00	33 750,00	3 375,00	37 125,00		
		Peinture	270,00	32 400,00	3 240,00	35 640,00		
		Moulures plafonds	1,00	45 000,00	4 500,00	49 500,00		
		Blocs portes, portes intérieures et béquillages	11,00	13 200,00	1 320,00	14 520,00		
		Plinthes	172,29	3 445,80	344,58	3 790,38		

30FRANK

Budget - 12 décembre 24

			Qt	Total HT	TVA	Total TTC	Commandes HT	Commandes
		Restauration porte palière	1,00	4 000,00	400,00	4 400,00		
		Garde-corps sur vide	10,84	5 420,00	542,00	5 962,00		
		Création escalier	1,00	15 000,00	1 500,00	16 500,00		
		Isolation intérieure façade	50,00	2 500,00	250,00	2 750,00		
		Isolation comble cis placo	125,00	16 250,00	1 625,00	17 875,00		
		Cloisonnement	94,50	8 505,00	850,50	9 355,50		
		Faux plafond	100,00	8 000,00	800,00	8 800,00		
		Déco hall et pièces de vie	1,00	35 000,00	3 500,00	38 500,00		
	CET hors salles d'eaux							
		Cfo	270,00	40 500,00	4 050,00	44 550,00		
		Cfa	270,00	20 250,00	2 025,00	22 275,00		
		CVC	270,00	74 250,00	7 425,00	81 675,00		
	Salles d'eaux							
		Mise en place de grandes salles de bains	2,00	28 000,00	2 800,00	30 800,00		
		Mise en place de petites salles de bains	1,00	9 000,00	900,00	9 900,00		
		Mise en places de sanitaires	2,00	10 000,00	1 000,00	11 000,00		
	Cuisine							
		Réalisation d'une cuisine aménagée	1,00	30 000,00	3 000,00	33 000,00		
Sous-total phase 2				**434 470,80**	**43 447,08**	**477 917,88**		
	Sous-total travaux HT			**677 715,46**	**62 871,55**	**740 587,01**		
	Imprévus		10%	67 771,55	6 777,15	74 548,70	1 810,00	13 14
	Sous-total travaux 2			**745 487,01**	**69 648,70**	**815 135,71**		
	Honoraires							
	ROM		1,00	70 000,00	14 000,00	84 000,00	70 000,00	1
	BET		1,00	25 000,00	5 000,00	30 000,00	8 500,00	2 3 6 10
	Divers		1,00	10 000,00	2 000,00	12 000,00	8 305,00	4 5 7 11 12
	Assurances		0,02	15 308,77	0,00	15 308,77	7 159,07	9

30FRANK

Budget - 12 décembre 24

	Qt	Total HT	TVA	Total TTC	Commandes HT	Commandes
Total HT		**865 795,77**	**90 648,70**	**956 444,47**	**374 764,28**	

30FRANK

Liste des factures - 12 décembre 24

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
25/01/2024	NH / 2024 / 010	ROM	25/01/2024	9 000,00	9 900,00	0%	13%	43%
25/03/2024	NH / 2024 / 036	ROM	25/03/2024	4 500,00	4 950,00	0%	6%	43%
19/03/2024	20240319-1	MS CONSEILS	08/04/2024	4 520,00	5 424,00	0%	83%	100%
19/03/2024	20240319-2	MS CONSEILS	08/04/2024	930,00	1 116,00	0%	17%	100%
18/04/2024	2024-04-372	AB Structures	02/05/2024	600,00	720,00	0%	100%	100%
05/05/2024	27880	PLASSE	05/05/2024	7 159,07	7 159,07	0%	100%	100%
22/03/2024	024-003-018	LS CONSEILS	06/06/2024	960,00	1 152,00	0%	30%	96%
21/05/2024	024-005-016	LS CONSEILS	06/06/2024	750,00	900,00	0%	23%	96%
17/05/2024	2024-6121	SMART DESIGN	06/06/2024	85 704,72	94 275,19	5%	31%	100%
17/05/2024	PA/24/0765	RISK CONTROL	06/06/2024	1 900,00	2 280,00	0%	40%	100%
25/05/2024	NH / 2024 / 053	ROM	06/06/2024	9 000,00	9 900,00	0%	13%	43%
07/03/2024	C240302	Cabinet de Contrôle	06/06/2024	600,00	720,00	0%	100%	100%
24/06/2024	024-006-016	LS CONSEILS	03/07/2024	750,00	825,00	0%	21%	96%
25/06/2024	PA/24/0960	RISK CONTROL	03/07/2024	1 000,00	1 200,00	0%	21%	100%
28/06/2024	NH / 2024 / 082	ROM	03/07/2024	4 500,00	4 950,00	0%	6%	43%
21/06/2024	2024-6135	SMART DESIGN	03/07/2024	71 315,13	78 446,65	5%	26%	100%
15/07/2024	024-007-003	LS CONSEILS	02/08/2024	1 810,00	1 991,00	0%	79%	93%
15/07/2024	024-007-004	LS CONSEILS	02/08/2024	740,00	814,00	0%	21%	96%
19/06/2024	024-007-005	LS CONSEILS	02/08/2024	995,00	1 094,50	0%	92%	92%
23/06/2024	PA/24/1180	RISK CONTROL	02/08/2024	500,00	600,00	0%	11%	100%
19/07/2024	2024-6158	SMART DESIGN	02/08/2024	48 099,24	52 909,17	5%	17%	100%
19/08/2024	2024-6164	SMART DESIGN	11/09/2024	35 175,56	38 693,11	5%	13%	100%
30/08/2024	024-010-014	LS CONSEILS	23/10/2024	280,00	336,00	0%	13%	93%
04/09/2024	PA/24/1405	RISK CONTROL	23/10/2024	500,00	600,00	0%	11%	100%
25/09/2024	NH / 2024 / 122	ROM	23/10/2024	3 000,00	3 300,00	0%	4%	43%
23/10/2024	TVA	LS CONSEILS	23/10/2024	0,00	429,50	0%	100%	100%
21/10/2024	PA/24/1731	RISK CONTROL	23/10/2024	800,00	960,00	0%	17%	100%
18/09/2024	2024-6178	SMART DESIGN	15/11/2024	2 525,82	2 778,40	0%	1%	100%
19/09/2024	2024-6183	SMART DESIGN	15/11/2024	23 522,83	25 875,11	0%	8%	100%
09/10/2024	2024-2352	SMART DESIGN	12/12/2024	12 646,92	13 911,61	0%	5%	100%
