MIRROR

Bordereau de paiement - 23 février 26

Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT	TVA	Montant TTC	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
253261451	JACOBS	23/02/2026	15 600,00	3 432,00	19 032,00	5%	95%
FT 28	ZAFFARONI	23/02/2026	78 000,00	0,00	78 000,00	7%	90%

97 032,00

Bon à payer

ROM
ROUX ŒUVRE MAITRISE
110 Boulevard Jean Jaurès
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
SAS au capital de 15.000€
RCS Nanterre B 408 566 701
APE 7112B – SIRET 408 566 701 000 53

MIRROR

Tableau récapitulatif du projet - 23 février 26

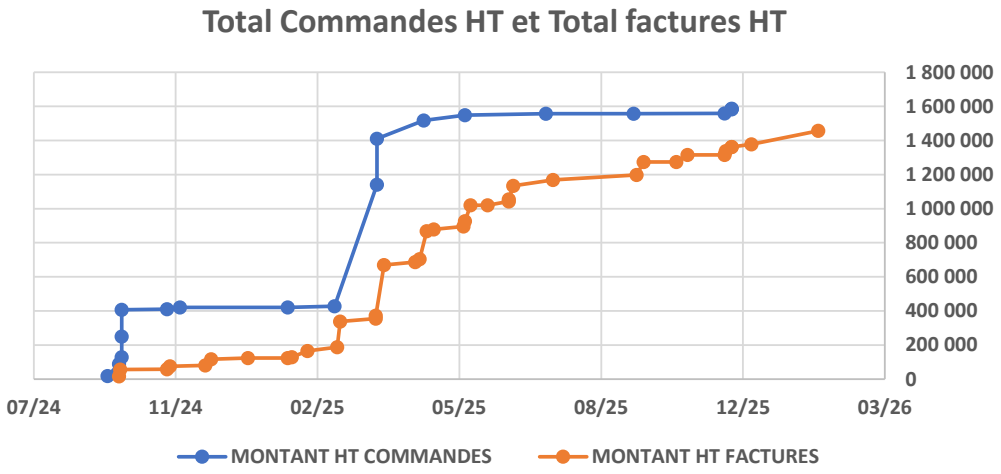

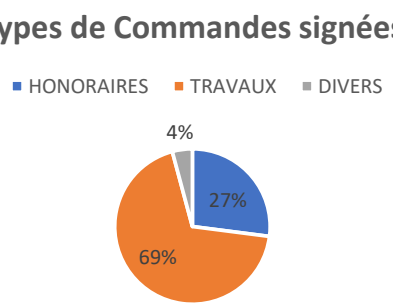

Récapitulatif des dépenses du projet	
Nombre total de commandes	**19**
Nombre total d'avenants	**11**
Nombre de commandes actives	**8**
Nombre total factures	**37**
Montant total commandes (HT)	**1 587 136,63**
Montant total factures (HT)	**1 456 322,54**
Total commandes honoraires (HT)	**429 120,00**
Total commandes travaux (HT)	**1 091 764,35**
Total commandes divers (HT)	**66 252,28**
Total TVA Commandes	**86 303,09**
Total TVA factures	**81 819,44**
Nombre de factures avec retenue	**8**
Montant total retenue de garantie (HT)	**108 736,70**
Montant total commandes (TTC)	**1 673 439,72**
Montant total factures (TTC)	**1 538 141,99**

Progression du paiement	
% D'avancement - 23 février 26	**6%**
% D'avancement total	**92%**

Bordereau de transmission

MIRROR

Tableau récapitulatif des commandes (LOTs) - 23 février 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	**Montant HT**	**LOT**	**Société**	**Montant HT**	**LOT**	**Société**	**Montant HT**	**LOT**
JACOBS	326 000,00	ARCHITECTE/BET	ZAFFARONI	1 091 764,35	Entreprise générale	ZAFFARONI	17 716,21	Vérification des systèmes
ROM	103 120,00	AMO				ARETI	44 254,54	Travaux électriques
						Municipalité de Rome	1 685,72	Frais administratifs - CILA
						ARCHPLUS	980,00	Remboursement des frais fiscaux
						Municipalité de Rome	1 615,81	Frais administratifs - Agibilità

MIRROR

Tableau récapitulatif des commandes (valeur HT restante) - 23 février 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	Montant HT	Valeur HT restante	Société	Montant HT	Valeur HT restante	Société	Montant HT	Valeur HT restante
JACOBS	326 000,00	17 680,00	ZAFFARONI	1 091 764,35	113 666,28	ZAFFARONI	17 716,21	0,00
ROM	103 120,00	0,00				ARETI	44 254,54	0,00
						Municipalité de Rome	1 685,72	0,00
						ARCHPLUS	980,00	0,00
						Municipalité de Rome	1 615,81	0,00

MIRROR

Tableau récapitulatif des commandes (% d'avancement) - 23 février 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	**Montant HT**	**% D'avancement**	**Société**	**Montant HT**	**% D'avancement**	**Société**	**Montant HT**	**% D'avancement**
JACOBS	326 000,00	95%	ZAFFARONI	1 091 764,35	90%	ZAFFARONI	17 716,21	100%
ROM	103 120,00	100%				ARETI	44 254,54	100%
						Municipalité de Rome	1 685,72	100%
						ARCHPLUS	980,00	100%
						Municipalité de Rome	1 615,81	100%

MIRROR

Budget - 23 février 26

Travaux	Budget	Engagés	Coûts futurs	Facturés	Reste à facturer
Travaux Architecturaux	99 500,00				
Travaux Electricité	505 000,00				
Travaux CVC	320 000,00				
Total Travaux	**924 500,00**	**1 091 764,35**	**-**	**978 630,26**	**113 134,09**
Honoraires					
AMO - ROM	72 000,00	103 120,00		103 120,00	-
BET - JACOBS	317 680,00	326 000,00		308 320,00	17 680,00
Total Honoraires	**389 680,00**	**429 120,00**	**-**	**411 440,00**	**17 680,00**
Divers					
Contrôle de l'installation	17 716,21	17 716,21		17 716,21	-
Ouverture du CILA	1 000,00	1 685,72		1 685,72	-
Frais cadastraux	700,00	2 595,81		2 595,81	-
Coûts des deux SCIA VVF	748,00		748,00		
Coûts de ARETI	54 500,00	44 254,54		44 254,54	-
Total Divers	**74 664,21**	**66 252,28**	**748,00**	**66 252,28**	**-**
Total HT	**1 388 844,21**	**1 587 136,63**	**748,00**	**1 456 322,54**	**130 814,09**
Aléas 5%	**69 442,21**				
Total HT avec Aléas	**1 458 286,42**				

Total HT (Engagés + Coûts futurs)		**1 587 884,63**	

Bordereau de transmission

MIRROR

Liste des factures - 23 février 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
25/09/2024	NH / 2024 / 130	ROM	10/10/2024	16 000,00	16 000,00	0%	16%	100%
26/09/2024	106525724	JACOBS	10/10/2024	40 000,00	48 800,00	0%	12%	95%
29/10/2024	16842	ARETI	10/10/2024	2 500,00	3 050,00	0%	6%	100%
31/10/2024	Fattura Zaffaroni	ZAFFARONI	13/12/2024	17 716,21	21 613,78	0%	100%	100%
25/11/2024	NH / 2024 / 162	ROM	13/12/2024	4 400,00	4 400,00	0%	4%	100%
29/11/2024	243261412	JACOBS	13/12/2024	36 400,00	44 408,00	0%	11%	95%
25/12/2024	NH / 2024 / 191	ROM	08/01/2025	6 000,00	6 000,00	0%	6%	100%
22/01/2025	---	Municipalité de Rome	22/01/2025	697,24	697,24	0%	41%	100%
05/02/2025	253260101	JACOBS	20/02/2025	36 400,00	44 408,00	0%	11%	95%
25/01/2025	NH / 2025 / 004	ROM	20/02/2025	6 000,00	6 000,00	0%	6%	100%
26/02/2025	253260225	JACOBS	11/03/2025	21 580,00	26 327,60	0%	7%	95%
25/03/2025	253260276	JACOBS	09/04/2025	16 900,00	20 618,00	0%	5%	95%
25/03/2025	NH / 2025 / 015	ROM	09/04/2025	17 500,00	17 500,00	0%	17%	100%
28/02/2025	FT 93	ZAFFARONI	09/04/2025	150 295,39	150 295,39	10%	14%	90%
31/03/2025	FT 94	ZAFFARONI	09/04/2025	297 554,67	297 554,67	10%	27%	90%
22/04/2025	253260392	JACOBS	06/05/2025	16 900,00	20 618,00	0%	5%	95%
25/04/2025	NH / 2025 / 043	ROM	06/05/2025	17 500,00	17 500,00	0%	17%	100%
05/05/2025	A00017644781	ARETI	06/05/2025	10 392,97	12 679,42	0%	23%	100%
27/05/2025	A00017645015	ARETI	27/05/2025	31 361,57	38 261,12	0%	71%	100%
30/04/2025	FT 168	ZAFFARONI	11/06/2025	163 250,57	163 250,57	10%	15%	90%
26/05/2025	253260613	JACOBS	11/06/2025	16 900,00	20 618,00	0%	5%	95%
31/05/2025	FT 197	ZAFFARONI	11/06/2025	94 220,62	94 220,62	10%	9%	90%
12/06/2025	---	Municipalité de Rome	12/06/2025	291,24	291,24	0%	41%	100%
27/06/2025	253260680	JACOBS	10/07/2025	21 580,00	26 327,60	0%	7%	95%
27/06/2025	NH-2025-0633	ROM	10/07/2025	11 720,00	11 720,00	0%	11%	100%
30/06/2025	FT 309	ZAFFARONI	30/07/2025	80 086,58	80 086,58	10%	7%	90%
28/07/2025	253260904	JACOBS	04/09/2025	34 580,00	42 187,60	0%	11%	95%
25/09/2025	253261057	JACOBS	10/10/2025	29 900,00	36 478,00	0%	9%	95%
30/09/2025	FT 440	ZAFFARONI	10/10/2025	74 938,73	74 938,73	10%	7%	90%
23/10/2025	---	Municipalité de Rome	23/10/2025	697,24	697,24	0%	41%	100%
31/10/2025	FT 514	ZAFFARONI	20/11/2025	40 283,69	40 283,69	10%	4%	90%
01/12/2025	NH-2025-1291	ROM	01/12/2025	24 000,00	24 000,00	0%	23%	100%

Liste des factures - 23 février 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
27/11/2025	253261298	JACOBS	01/12/2025	21 580,00	26 327,60	0%	7%	95%
26/11/2025	---	ARCHPLUS	01/12/2025	980,00	980,00	0%	41%	100%
01/12/2025	5285900964	Municipalité de Rome	01/12/2025	1 615,81	1 971,29	0%	100%	100%
15/12/2025	253261451	JACOBS	23/02/2026	15 600,00	19 032,00	0%	5%	95%
31/01/2026	FT 28	ZAFFARONI	23/02/2026	78 000,00	78 000,00	10%	7%	90%
