REINE

Bordereau de paiement - 13 mars 26

Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT	TVA	Montant TTC	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
165	TECTA	13/03/2026	3 200,00	640,00	3 840,00	14%	50%
2420	SATO	13/03/2026	5 550,00	1 110,00	6 660,00	1%	75%
3211	EMPEERING	13/03/2026	14 000,00	2 800,00	16 800,00	3%	43%
FC-26-02-16	DGM	13/03/2026	5 040,00	1 008,00	6 048,00	1%	90%
026-002-019	LS CONSEILS	13/03/2026	1 975,00	395,00	2 370,00	7%	98%
026-002-020	LS CONSEILS	13/03/2026	2 500,00	500,00	3 000,00	9%	98%
NH-2026-0221	ROM	13/03/2026	18 000,00	3 600,00	21 600,00	6%	71%
3156	EMPEERING	13/03/2026	11 000,00	2 200,00	13 200,00	2%	43%
11581	BTP Consultant	13/03/2026	4 800,00	960,00	5 760,00	10%	58%
Situation 10	LOT 12 - CITC	13/03/2026	111 720,50	22 344,10	134 064,60	11%	70%
Situation 6	LOT 13/14 - EMI	13/03/2026	126 544,38	25 308,88	151 853,26	22%	58%
Situation 8	LOT 01 - LBC	13/03/2026	57 347,36	11 469,47	68 816,83	3%	66%
Situation 4	LOT 02 - ODA	13/03/2026	17 692,07	3 538,41	21 230,48	10%	69%
Situation 6	LOT 03 - VALLEE	13/03/2026	8 082,95	1 616,59	9 699,54	4%	74%
Situation 3	LOT 05 - 3C CONSTRUCTION	13/03/2026	30 986,18	6 197,24	37 183,42	11%	32%
IDC2600291	ID CAPTURE	13/03/2026	405,00	81,00	486,00	8%	68%
					502 612,13		

Bon à payer

ROM
ROUX ŒUVRE MAITRISE
110 Boulevard Jean Jaurès
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
SAS au capital de 15.000€
RCS Nanterre B 408 566 701
APE 7112B – SIRET 408 566 701 000 53

Bordereau de transmission

REINE

Tableau récapitulatif du projet - 13 mars 26

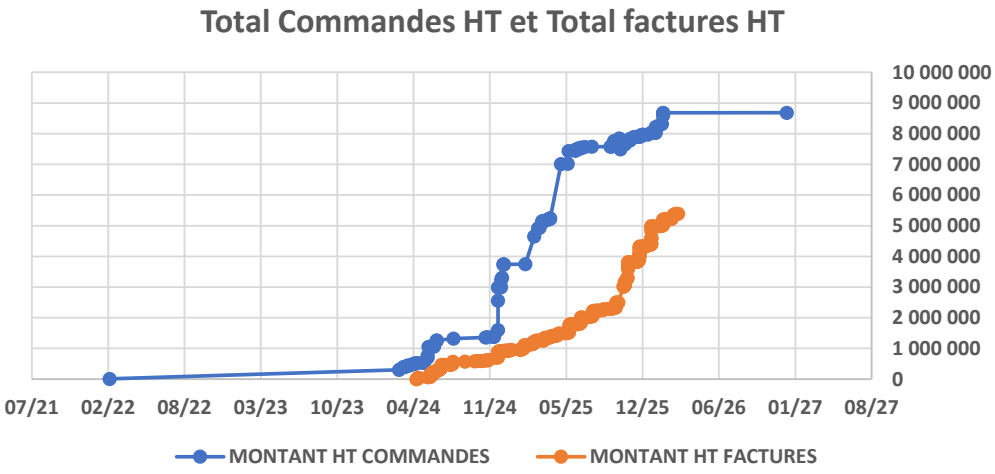

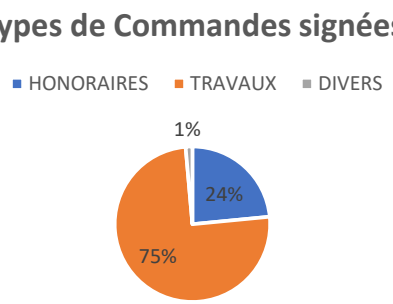

Récapitulatif des dépenses du projet	
Nombre total de commandes	**109**
Nombre total d'avenants	**64**
Nombre de commandes actives	**45**
Nombre total factures	**233**
Montant total commandes (HT)	**8 682 466,45**
Montant total factures (HT)	**5 390 657,98**
Total commandes honoraires (HT)	**2 037 156,00**
Total commandes travaux (HT)	**6 523 378,99**
Total commandes divers (HT)	**121 931,46**
Total TVA Commandes	**1 736 493,29**
Total TVA factures	**1 078 131,59**
Nombre de factures avec retenue	**52**
Montant total retenue de garantie (HT)	**144 963,78**
Montant total commandes (TTC)	**10 418 959,74**
Montant total factures (TTC)	**6 468 789,57**

Progression du paiement	
% D'avancement - 13 mars 26	**5%**
% D'avancement total	**62%**

Bordereau de transmission

REINE

Tableau récapitulatif des commandes (LOTs) - 13 mars 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	**Montant HT**	**LOT**	**Société**	**Montant HT**	**LOT**	**Société**	**Montant HT**	**LOT**
DGM	427 340,00	ARCHITECTE	SFB	77 767,94	Terrassement-Dépollution	BVF	16 295,00	Géomètre
ROM	324 000,00	AMO	LOT 10 - KONE	52 500,00	ASCENSEURS	Detect Réseaux	2 300,00	Localisation des réseaux
SATO	397 000,00	BE Fluides et structure	LOT 04 - SMART DESIGN	0,00	MENUISERIES EXT.	IELYS	4 400,00	Sondages
LS CONSEILS	28 366,00	CSPS	LOT 00/01 - SMART DESIGN	210 902,37	CHANTIER/DEMOL.	VEDIA	9 800,00	Diagnostic structure
EICP	105 700,00	Économiste	LOT 12 - CITC	1 032 813,96	CVC/PLOMBERIE	ID CAPTURE	4 995,00	Plateforme
SOLER IDE	24 400,00	Assistance aux contrats	LOT 05 - 3C CONSTRUCTION	271 830,75	METALL./SERR.	BC2A	2 500,00	Diagnostic plomb
LASA	47 000,00	BE ACOUSTIQUE	LOT 03 - VALLEE	198 945,05	RAVELEMENT	LS CONSEILS	13 883,00	Réperage amiante
INGEPREV	28 600,00	BE FEU ET INCENDIE	LOT 06/07/08/09/11 - VALLEE	908 848,83	CLO./MAN./REV./PEIN./NET.	BVF	11 302,00	Géomètre
SOL CONSEIL	11 100,00	BE Géotechnique	LOT 13/14 - EMI	573 226,51	CFO/CFA	ENEDIS	33 215,28	Réseaux
BTP Consultant	46 600,00	Bureau de Contrôle	LOT VRD - TERIDEAL	287 216,97	VRD	EAU IDF	23 241,18	Branchement d'eau
CSD	19 350,00	Coordination incendie	FBDS DESAMIANTAGE	35 680,00	DESAMIANTAGE			
EMPEERING	487 000,00	MOEX/OPC	LOT 01 - LBC	2 204 146,91	CHANTIER/DEMOL. 2			
TECTA	6 000,00	BET VRD	LOT 04 - DELEBECQUE	415 000,00	MENUISERIES EXT. 2			
TECTA	23 300,00	Direction Travaux	LOT 02 - ODA	178 503,02	ETANCHEITE			
EMPEERING	46 000,00	ACT	LOT 16 - PINSON PAYSAGE	73 987,28	PAYSAGE			
LS CONSEILS	5 400,00	MOE	SPORT et PAYSAGES	16 509,40	PAYSAGE 2			
BIS CONSULTANTS	6 650,00	BE Géotechnique 2						
Terabilis	2 400,00	MOE Conception						
LS CONSEILS	950,00	MOE Désamiantage						

REINE

Tableau récapitulatif des commandes (valeur HT restante) - 13 mars 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	Montant HT	Valeur HT restante	Société	Montant HT	Valeur HT restante	Société	Montant HT	Valeur HT restante
DGM	427 340,00	42 750,00	SFB	77 767,94	3 025,36	BVF	16 295,00	0,00
ROM	324 000,00	92 700,00	LOT 10 - KONE	52 500,00	6 415,50	Detect Réseaux	2 300,00	0,00
SATO	397 000,00	99 600,00	LOT 04 - SMART DESIGN	0,00	0,00	IELYS	4 400,00	0,00
LS CONSEILS	28 366,00	552,00	LOT 00/01 - SMART DESIGN	210 902,37	0,00	VEDIA	9 800,00	9 800,00
EICP	105 700,00	17 600,00	LOT 12 - CITC	1 032 813,96	313 471,01	ID CAPTURE	4 995,00	1 620,00
SOLER IDE	24 400,00	1 900,00	LOT 05 - 3C CONSTRUCTION	271 830,75	185 080,42	BC2A	2 500,00	0,00
LASA	47 000,00	27 287,50	LOT 03 - VALLEE	198 945,05	50 908,84	LS CONSEILS	13 883,00	0,00
INGEPREV	28 600,00	11 200,00	LOT 06/07/08/09/11 - VALLEE	908 848,83	662 485,26	BVF	11 302,00	0,80
SOL CONSEIL	11 100,00	0,00	LOT 13/14 - EMI	573 226,51	238 553,41	ENEDIS	33 215,28	0,00
BTP Consultant	46 600,00	19 632,39	LOT VRD - TERIDEAL	287 216,97	133 233,51	EAU IDF	23 241,18	2 104,46
CSD	19 350,00	13 500,00	FBDS DESAMIANTAGE	35 680,00	0,00			
EMPEERING	487 000,00	279 000,00	LOT 01 - LBC	2 204 146,91	756 196,97			
TECTA	6 000,00	0,00	LOT 04 - DELEBECQUE	415 000,00	172 462,52			
TECTA	23 300,00	11 700,00	LOT 02 - ODA	178 503,02	54 504,47			
EMPEERING	46 000,00	1 500,00	LOT 16 - PINSON PAYSAGE	73 987,28	71 964,66			
LS CONSEILS	5 400,00	0,00	SPORT et PAYSAGES	16 509,40	16 509,40			
BIS CONSULTANTS	6 650,00	6 650,00						
Terabilis	2 400,00	2 400,00						
LS CONSEILS	950,00	0,00						

REINE

Tableau récapitulatif des commandes (% d'avancement) - 13 mars 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	Montant HT	% D'avancement	Société	Montant HT	% D'avancement	Société	Montant HT	% D'avancement
DGM	427 340,00	90%	SFB	77 767,94	96%	BVF	16 295,00	100%
ROM	324 000,00	71%	LOT 10 - KONE	52 500,00	88%	Detect Réseaux	2 300,00	100%
SATO	397 000,00	75%	LOT 04 - SMART DESIGN	0,00	0%	IELYS	4 400,00	100%
LS CONSEILS	28 366,00	98%	LOT 00/01 - SMART DESIGN	210 902,37	100%	VEDIA	9 800,00	0%
EICP	105 700,00	83%	LOT 12 - CITC	1 032 813,96	70%	ID CAPTURE	4 995,00	68%
SOLER IDE	24 400,00	92%	LOT 05 - 3C CONSTRUCTION	271 830,75	32%	BC2A	2 500,00	100%
LASA	47 000,00	42%	LOT 03 - VALLEE	198 945,05	74%	LS CONSEILS	13 883,00	100%
INGEPREV	28 600,00	61%	LOT 06/07/08/09/11 - VALLEE	908 848,83	27%	BVF	11 302,00	100%
SOL CONSEIL	11 100,00	100%	LOT 13/14 - EMI	573 226,51	58%	ENEDIS	33 215,28	100%
BTP Consultant	46 600,00	58%	LOT VRD - TERIDEAL	287 216,97	54%	EAU IDF	23 241,18	91%
CSD	19 350,00	30%	FBDS DESAMIANTAGE	35 680,00	100%			
EMPEERING	487 000,00	43%	LOT 01 - LBC	2 204 146,91	66%			
TECTA	6 000,00	100%	LOT 04 - DELEBECQUE	415 000,00	58%			
TECTA	23 300,00	50%	LOT 02 - ODA	178 503,02	69%			
EMPEERING	46 000,00	97%	LOT 16 - PINSON PAYSAGE	73 987,28	3%			
LS CONSEILS	5 400,00	100%	SPORT et PAYSAGES	16 509,40	0%			
BIS CONSULTANTS	6 650,00	0%						
Terabilis	2 400,00	0%						
LS CONSEILS	950,00	100%						

REINE

Liste des factures - 13 mars 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
26/04/2024	2024 04 1010	SOLER IDE	26/04/2024	1 500,00	1 800,00	0%	6%	92%
30/04/2024	1751	SATO	30/04/2024	31 200,00	37 440,00	0%	8%	75%
30/04/2024	F24047460	BVF	30/04/2024	4 358,00	5 229,60	0%	27%	100%
30/04/2024	FA-2024040024	INGEPREV	30/04/2024	6 000,00	7 200,00	0%	21%	61%
25/05/2024	NH / 2024 / 047	ROM	25/05/2024	24 300,00	29 160,00	0%	8%	71%
31/05/2024	F24057503	BVF	31/05/2024	3 268,50	3 922,20	0%	20%	100%
31/05/2024	F24057504	BVF	31/05/2024	3 400,00	4 080,00	0%	21%	100%
07/06/2024	F-92-2406-230	Detect Réseaux	07/06/2024	2 300,00	2 760,00	0%	100%	100%
25/06/2024	2024 06 0660	SOL CONSEIL	25/06/2024	4 800,00	5 760,00	0%	43%	100%
28/06/2024	P-240612030	LASA	28/06/2024	1 650,00	1 980,00	0%	4%	42%
28/06/2024	P-240612029	LASA	28/06/2024	6 200,00	7 440,00	0%	13%	42%
28/06/2024	2024 06 1761	SOLER IDE	28/06/2024	3 500,00	4 200,00	0%	14%	92%
14/06/2024	FC-24-06-10	DGM	09/07/2024	23 400,00	28 080,00	0%	5%	90%
14/06/2024	FC-24-06-11	DGM	09/07/2024	5 200,00	6 240,00	0%	1%	90%
24/06/2024	FC-24-06-26	DGM	09/07/2024	43 875,00	52 650,00	0%	10%	90%
19/06/2024	F24067528	BVF	09/07/2024	3 268,50	3 922,20	0%	20%	100%
31/05/2024	P-240511994	LASA	09/07/2024	1 650,00	1 980,00	0%	4%	42%
31/05/2024	P-240511995	LASA	09/07/2024	9 100,00	10 920,00	0%	19%	42%
25/06/2024	FA0522	IELYS	09/07/2024	4 400,00	5 280,00	0%	100%	100%
24/06/2024	FC-24-06-27	DGM	09/07/2024	9 750,00	11 700,00	0%	2%	90%
27/06/2024	Situation 1	CSD	09/07/2024	810,00	972,00	0%	4%	30%
31/05/2024	FC-24-05-27	DGM	09/07/2024	10 000,00	12 000,00	0%	2%	90%
31/05/2024	FC-24-05-26	DGM	09/07/2024	43 875,00	52 650,00	0%	10%	90%
09/07/2024	27762	BTP Consultant	09/07/2024	4 500,00	5 400,00	0%	10%	58%
07/06/2024	FC-24-06-03	DGM	09/07/2024	73 125,00	87 750,00	0%	17%	90%
07/06/2024	FC-24-06-04	DGM	09/07/2024	16 000,00	19 200,00	0%	4%	90%
29/07/2024	2024 07 2063	SOLER IDE	29/07/2024	4 900,00	5 880,00	0%	20%	92%
30/06/2024	1811	SATO	02/08/2024	119 800,00	143 760,00	0%	30%	75%
23/07/2024	Situation 2	CSD	02/08/2024	1 890,00	2 268,00	0%	10%	30%
25/06/2024	NH / 2024 / 064	ROM	02/08/2024	9 000,00	10 800,00	0%	3%	71%
25/07/2024	NH / 2024 / 096	ROM	02/08/2024	9 000,00	10 800,00	0%	3%	71%
30/07/2024	2024-07-205	EICP	02/08/2024	75 700,00	90 840,00	0%	72%	83%

Bordereau de transmission

REINE

Liste des factures - 13 mars 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
30/07/2024	A2024-534	TECTA	02/08/2024	4 800,00	5 760,00	0%	80%	100%
31/08/2024	2268	EMPEERING	11/10/2024	6 000,00	7 200,00	0%	13%	97%
25/09/2024	NH / 2024 / 128	ROM	11/10/2024	9 000,00	10 800,00	0%	3%	71%
31/10/2024	2024 10 3056	SOLER IDE	31/10/2024	6 400,00	7 680,00	0%	26%	92%
30/09/2024	2317	EMPEERING	19/11/2024	6 000,00	7 200,00	0%	13%	97%
25/10/2024	NH / 2024 / 144	ROM	19/11/2024	18 000,00	21 600,00	0%	6%	71%
16/10/2024	A2024-675	TECTA	19/11/2024	1 200,00	1 440,00	0%	20%	100%
27/11/2024	2024 11 3255	SOLER IDE	27/11/2024	3 700,00	4 440,00	0%	15%	92%
11/10/2024	024-011-015	LS CONSEILS	12/12/2024	4 578,00	5 493,60	0%	16%	98%
29/11/2024	1955	SATO	12/12/2024	14 000,00	16 800,00	0%	4%	75%
25/11/2024	Acompte	LOT 00/01 - SMART DESIGN	12/12/2024	91 200,00	109 440,00	5%	43%	100%
25/11/2024	Situation 1	LOT 12 - CITC	12/12/2024	91 200,00	109 440,00	5%	9%	70%
20/11/2024	24 11 45	SFB	12/12/2024	74 742,58	89 691,10	2%	96%	96%
25/11/2024	NH / 2024 / 160	ROM	12/12/2024	9 000,00	10 800,00	0%	3%	71%
24/12/2024	2024 12 3769	SOLER IDE	24/12/2024	2 500,00	3 000,00	0%	10%	92%
25/12/2024	NH / 2024 / 188	ROM	14/01/2025	9 000,00	10 800,00	0%	3%	71%
13/12/2024	202412039	BC2A	14/01/2025	2 500,00	3 000,00	0%	100%	100%
31/12/2024	2478	EMPEERING	14/01/2025	14 000,00	16 800,00	0%	3%	43%
30/11/2024	2419	EMPEERING	14/01/2025	14 000,00	16 800,00	0%	3%	43%
16/12/2024	024-012-016	LS CONSEILS	14/01/2025	1 070,00	1 284,00	0%	4%	98%
20/12/2024	241964	ID CAPTURE	14/01/2025	1 350,00	1 620,00	0%	27%	68%
22/01/2025	2474	BTP Consultant	22/01/2025	2 790,00	3 348,00	0%	6%	58%
31/01/2025	2025-01-236	EICP	07/02/2025	12 400,00	14 880,00	0%	12%	83%
03/02/2025	Situation 1	LOT 00/01 - SMART DESIGN	07/02/2025	83 871,37	100 645,64	Caution	40%	100%
24/01/2025	Situation 1	LOT 05 - 3C CONSTRUCTION	07/02/2025	11 717,39	14 060,87	5%	4%	32%
28/01/2025	025-001-017	LS CONSEILS	07/02/2025	1 070,00	1 284,00	0%	4%	98%
25/01/2025	NH / 2025 / 003	ROM	07/02/2025	9 000,00	10 800,00	0%	3%	71%
28/02/2025	P-250212514	LASA	13/03/2025	1 112,50	1 335,00	0%	2%	42%
30/01/2025	2533	EMPEERING	13/03/2025	14 000,00	16 800,00	0%	3%	43%
24/02/2025	025-002-022	LS CONSEILS	13/03/2025	1 070,00	1 284,00	0%	4%	98%
25/02/2025	NH / 2025 / 011	ROM	13/03/2025	9 000,00	10 800,00	0%	3%	71%
26/02/2025	2025 02 0212	SOL CONSEIL	13/03/2025	4 500,00	5 400,00	0%	41%	100%

Bordereau de transmission

REINE

Liste des factures - 13 mars 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
31/01/2025	2089	SATO	13/03/2025	22 200,00	26 640,00	0%	6%	75%
05/03/2025	Situation 2	LOT 00/01 - SMART DESIGN	13/03/2025	35 831,00	42 997,20	Caution	17%	100%
21/02/2025	Situation 1	LOT 10 - KONE	13/03/2025	14 553,00	17 463,60	Caution	28%	88%
21/02/2025	Situation 1	LOT 12 - CITC	13/03/2025	10 827,83	12 993,40	Caution	9%	70%
07/03/2025	9370	BTP Consultant	13/03/2025	2 685,00	3 222,00	0%	6%	58%
14/02/2025	FC-25-02-10	DGM	10/04/2025	14 625,00	17 550,00	0%	3%	90%
26/02/2025	FC-25-02-39	DGM	10/04/2025	12 025,00	14 430,00	0%	3%	90%
26/02/2025	FC-25-02-40	DGM	10/04/2025	29 250,00	35 100,00	0%	7%	90%
25/03/2025	025-003-028	LS CONSEILS	10/04/2025	2 650,00	3 180,00	0%	49%	100%
27/03/2025	IDC250519	ID CAPTURE	10/04/2025	405,00	486,00	0%	8%	68%
25/03/2025	025-003-027	LS CONSEILS	10/04/2025	1 070,00	1 284,00	0%	4%	98%
28/02/2025	2588	EMPEERING	10/04/2025	14 000,00	16 800,00	0%	3%	43%
13/03/2025	025-003-009	LS CONSEILS	10/04/2025	3 678,00	4 413,60	0%	26%	100%
25/03/2025	NH / 2025 / 014	ROM	10/04/2025	9 000,00	10 800,00	0%	3%	71%
29/03/2025	FC-25-03-26	DGM	10/04/2025	5 850,00	7 020,00	0%	1%	90%
03/04/2025	F25048080 / RT	BVF	10/04/2025	1 880,00	2 256,00	0%	17%	100%
27/03/2025	F25048081 / RT	BVF	10/04/2025	2 240,00	2 688,00	0%	20%	100%
10/04/2025	Acompte	ENEDIS	11/04/2025	6 656,34	7 987,61	0%	20%	100%
31/03/2025	2655	EMPEERING	07/05/2025	14 000,00	16 800,00	0%	3%	43%
15/04/2025	CP 0	LOT VRD - TERIDEAL	07/05/2025	42 370,78	50 844,94	0%	15%	54%
25/04/2025	NH / 2025 / 042	ROM	07/05/2025	9 000,00	10 800,00	0%	3%	71%
23/04/2025	025-004-016	LS CONSEILS	07/05/2025	1 070,00	1 284,00	0%	4%	98%
05/05/2025	Solde	ENEDIS	07/05/2025	26 558,94	31 870,73	0%	80%	100%
30/04/2025	F25048110 / RT	BVF	07/05/2025	2 820,00	3 384,00	0%	25%	100%
11/04/2025	F25048088 / GF	BVF	07/05/2025	250,00	300,00	0%	2%	100%
30/04/2025	Situation 2	LOT 12 - CITC	07/05/2025	31 670,80	38 004,96	Caution	3%	70%
26/03/2025	Acompte	LOT 13/14 - EMI	07/05/2025	43 000,00	51 600,00		8%	58%
26/03/2025	Situation 1	LOT 13/14 - EMI	07/05/2025	13 182,00	15 818,40		2%	58%
27/05/2025	6176488	EAU IDF	27/05/2025	4 880,30	5 856,36	0%	21%	91%
03/06/2025	FC-25-06-01	DGM	16/06/2025	2 160,00	2 592,00	0%	1%	90%
04/06/2025	025-006-001	LS CONSEILS	16/06/2025	3 438,00	4 125,60	0%	25%	100%
30/05/2025	2025-048	FBDS DESAMIANTAGE	16/06/2025	21 180,00	25 416,00	0%	59%	100%

Bordereau de transmission

REINE

Liste des factures - 13 mars 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
30/05/2025	025-005-022	LS CONSEILS	16/06/2025	2 600,00	3 120,00	0%	19%	100%
19/05/2025	FC-25-05-16	DGM	16/06/2025	5 850,00	7 020,00	0%	1%	90%
30/05/2025	FC-25-05-49	DGM	16/06/2025	2 160,00	2 592,00	0%	1%	90%
30/05/2025	NH-2025-057	ROM	16/06/2025	9 000,00	10 800,00	0%	3%	71%
26/05/2025	FA-2025050016	INGEPREV	16/06/2025	4 200,00	5 040,00	0%	15%	61%
07/06/2025	23604	BTP Consultant	16/06/2025	2 585,00	3 102,00	0%	6%	58%
30/04/2025	Situation 1 - DET	TECTA	16/06/2025	840,00	1 008,00	0%	4%	50%
21/05/2025	025-005-012	LS CONSEILS	16/06/2025	1 070,00	1 284,00	0%	4%	98%
21/05/2025	025-005-013	LS CONSEILS	16/06/2025	2 750,00	3 300,00	0%	51%	100%
30/04/2025	2707	EMPEERING	16/06/2025	14 000,00	16 800,00	0%	3%	43%
27/05/2025	6176488 - 2	EAU IDF	16/06/2025	4 880,28	5 856,34	0%	21%	91%
31/05/2025	Situation 3	LOT 12 - CITC	16/06/2025	74 932,63	89 919,16	Caution	7%	70%
10/04/2025	6111870	EAU IDF	16/06/2025	4 635,84	5 563,01	0%	20%	91%
03/07/2025	6248620	EAU IDF	03/07/2025	6 740,30	8 088,36	0%	29%	91%
20/06/2025	IDC250961	ID CAPTURE	10/07/2025	405,00	486,00	0%	8%	68%
30/06/2025	2813	EMPEERING	10/07/2025	14 000,00	16 800,00	0%	3%	43%
30/06/2025	2814	EMPEERING	10/07/2025	7 500,00	9 000,00	0%	16%	97%
30/06/2025	F25068212 / RT	BVF	10/07/2025	3 361,20	4 033,44	0%	30%	100%
26/06/2025	Situation 2 - DET	TECTA	10/07/2025	2 520,00	3 024,00	0%	11%	50%
27/06/2025	NH-2025-0632	ROM	10/07/2025	9 000,00	10 800,00	0%	3%	71%
26/06/2025	Situation 3	CSD	10/07/2025	1 800,00	2 160,00	0%	9%	30%
24/06/2025	FC-25-06-48	DGM	10/07/2025	5 850,00	7 020,00	0%	1%	90%
20/06/2025	025-006-016	LS CONSEILS	10/07/2025	1 070,00	1 284,00	0%	4%	98%
31/05/2025	2754	EMPEERING	10/07/2025	14 000,00	16 800,00	0%	3%	43%
31/05/2025	2753	EMPEERING	10/07/2025	10 000,00	12 000,00	0%	22%	97%
01/06/2025	Acompte	LOT 04 - DELEBECQUE	10/07/2025	83 000,00	99 600,00	Caution	20%	58%
31/10/2024	2369	EMPEERING	10/07/2025	6 000,00	7 200,00	0%	1%	43%
25/07/2025	FC-25-07-57	DGM	31/07/2025	5 850,00	7 020,00	0%	1%	90%
30/06/2025	FC-25-06-59	DGM	31/07/2025	12 025,00	14 430,00	0%	3%	90%
24/07/2025	025-007-018	LS CONSEILS	31/07/2025	1 070,00	1 284,00	0%	4%	98%
31/07/2025	2858	EMPEERING	10/09/2025	14 000,00	16 800,00	0%	3%	43%
31/07/2025	2859	EMPEERING	10/09/2025	7 500,00	9 000,00	0%	16%	97%

REINE

Liste des factures - 13 mars 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
22/08/2025	025-008-012	LS CONSEILS	10/09/2025	1 070,00	1 284,00	0%	4%	98%
21/07/2025	2240	SATO	10/09/2025	17 760,00	21 312,00	0%	4%	75%
07/08/2025	34121	BTP Consultant	10/09/2025	2 485,00	2 982,00	0%	5%	58%
01/06/2025	Situation 1	LOT 01 - LBC	10/09/2025	50 293,14	60 351,76	7%	2%	66%
01/07/2025	Situation 2	LOT 01 - LBC	10/09/2025	112 389,77	134 867,72	7%	5%	66%
01/08/2025	Situation 3	LOT 01 - LBC	10/09/2025	147 105,61	176 526,74	7%	7%	66%
11/08/2025	Situation 2	LOT 13/14 - EMI	10/09/2025	17 213,30	20 655,96	Caution	3%	58%
30/06/2025	Situation 4	LOT 12 - CITC	10/09/2025	43 018,52	51 622,22	Caution	4%	70%
29/08/2025	FC-25-08-26	DGM	10/09/2025	5 850,00	7 020,00	0%	1%	90%
01/08/2025	NH-2025-0840	ROM	10/09/2025	9 000,00	10 800,00	0%	3%	71%
09/09/2025	NH-2025-0947	ROM	10/09/2025	9 000,00	10 800,00	0%	3%	71%
31/07/2025	2025 07 1119	SOL CONSEIL	10/09/2025	1 800,00	2 160,00	0%	16%	100%
30/06/2025	F25068220 / RT	BVF	10/09/2025	750,00	900,00	0%	7%	100%
31/08/2025	Situation 5	LOT 12 - CITC	15/09/2025	17 130,86	20 557,03	Caution	2%	70%
25/08/2025	Situation 1	LOT 03 - VALLEE	15/09/2025	18 866,70	22 640,04	Caution	9%	74%
07/10/2025	43190	BTP Consultant	09/10/2025	2 385,00	2 862,00	0%	5%	58%
25/09/2025	FC-25-09-58	DGM	09/10/2025	5 850,00	7 020,00	0%	1%	90%
02/10/2025	A2025-787	TECTA	09/10/2025	3 360,00	4 032,00	0%	14%	50%
30/09/2025	FA-2025090037	INGEPREV	09/10/2025	2 200,00	2 640,00	0%	8%	61%
30/09/2025	2987	EMPEERING	09/10/2025	14 000,00	16 800,00	0%	3%	43%
30/09/2025	2988	EMPEERING	09/10/2025	7 500,00	9 000,00	0%	16%	97%
29/09/2025	IDC2501368	ID CAPTURE	09/10/2025	405,00	486,00	0%	8%	68%
29/09/2025	NH-2025-0965	ROM	09/10/2025	9 000,00	10 800,00	0%	3%	71%
19/09/2025	025-009-020	LS CONSEILS	09/10/2025	1 052,00	1 262,40	0%	4%	98%
25/09/2025	CP 01	LOT VRD - TERIDEAL	09/10/2025	35 046,43	42 055,72	0%	12%	54%
30/09/2025	Situation 3	LOT 13/14 - EMI	10/10/2025	5 012,93	6 015,52	Caution	1%	58%
30/09/2025	Situation 6	LOT 12 - CITC	10/10/2025	4 178,08	5 013,70	Caution	0%	70%
30/09/2025	2290	SATO	11/11/2025	25 530,00	30 636,00	0%	6%	75%
28/10/2025	CP 02	LOT VRD - TERIDEAL	11/11/2025	76 566,25	91 879,50	0%	27%	54%
24/10/2025	F25108443	BVF	11/11/2025	2 000,00	2 400,00	0%	12%	100%
21/10/2025	A2025-842	TECTA	11/11/2025	1 680,00	2 016,00	0%	7%	50%
24/10/2025	FC-25-10-59	DGM	11/11/2025	5 850,00	7 020,00	0%	1%	90%

REINE

Liste des factures - 13 mars 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
24/10/2025	025-010-021	LS CONSEILS	11/11/2025	1 526,00	1 831,20	0%	5%	98%
31/10/2025	2313	SATO	11/11/2025	44 710,00	53 652,00	0%	11%	75%
23/10/2025	Situation 2	LOT 03 - VALLEE	18/11/2025	40 817,56	48 981,07	Caution	21%	74%
24/10/2025	Situation 1	LOT 04 - DELEBECQUE	18/11/2025	102 230,53	122 676,64	Caution	25%	58%
20/10/2025	Situation 4	LOT 01 - LBC	18/11/2025	517 494,39	620 993,27	7%	23%	66%
01/11/2025	Situation 1	LOT 02 - ODA	04/12/2025	30 192,84	36 231,41	5%	17%	69%
01/11/2025	Situation 3	LOT 03 - VALLEE	04/12/2025	31 572,64	37 887,17	Caution	16%	74%
01/11/2025	Situation 2	LOT 04 - DELEBECQUE	04/12/2025	43 396,27	52 075,52	Caution	10%	58%
01/11/2025	Situation 2	LOT 10 - KONE	04/12/2025	31 531,50	37 837,80	2%	60%	88%
01/11/2025	Situation 7	LOT 12 - CITC	04/12/2025	21 288,83	25 546,60	Caution	2%	70%
01/10/2025	Situation 0	LOT 06/07/08/09/11 - VALLEE	04/12/2025	97 000,00	116 400,00	Caution	11%	27%
01/11/2025	Situation 1	LOT 06/07/08/09/11 - VALLEE	04/12/2025	59 928,15	71 913,78	2%	7%	27%
27/11/2025	FC-25-11-94	DGM	04/12/2025	11 520,00	13 824,00	0%	3%	90%
27/11/2025	NH-2025-1189	ROM	04/12/2025	18 000,00	21 600,00	0%	6%	71%
25/11/2025	FC-25-11-76	DGM	04/12/2025	5 850,00	7 020,00	0%	1%	90%
12/11/2025	NH-2025-1184	ROM	04/12/2025	9 000,00	10 800,00	0%	3%	71%
01/11/2025	Situation 5	LOT 01 - LBC	04/12/2025	282 981,24	339 577,48	7%	13%	66%
24/11/2025	025-011-019	LS CONSEILS	04/12/2025	1 526,00	1 831,20	0%	5%	98%
31/10/2025	3048	EMPEERING	04/12/2025	14 000,00	16 800,00	0%	3%	43%
01/12/2025	Situation 6	LOT 01 - LBC	13/01/2026	130 576,25	156 691,50	7%	6%	66%
01/12/2025	Situation 2	LOT 02 - ODA	13/01/2026	54 250,28	65 100,34	5%	30%	69%
01/12/2025	Situation 4	LOT 03 - VALLEE	13/01/2026	31 482,82	37 779,38	Caution	16%	74%
01/12/2025	Situation 3	LOT 04 - DELEBECQUE	13/01/2026	13 910,68	16 692,82	Caution	3%	58%
01/12/2025	Situation 2	LOT 05 - 3C CONSTRUCTION	13/01/2026	44 046,76	52 856,11	7%	16%	32%
01/12/2025	Situation 8	LOT 12 - CITC	13/01/2026	89 846,07	107 815,28	Caution	9%	70%
01/12/2025	Situation 4	LOT 13/14 - EMI	13/01/2026	37 515,37	45 018,44	Caution	7%	58%
01/12/2025	Situation 2	LOT 06/07/08/09/11 - VALLEE	13/01/2026	46 949,56	56 339,47	2%	5%	27%
22/12/2025	025-012-020	LS CONSEILS	13/01/2026	1 567,00	1 880,40	0%	11%	100%
23/12/2025	FC-25-12-115	DGM	13/01/2026	3 600,00	4 320,00	0%	1%	90%
30/12/2025	2371	SATO	13/01/2026	16 650,00	19 980,00	0%	4%	75%
31/12/2025	NH-2025-12102	ROM	13/01/2026	9 000,00	10 800,00	0%	3%	71%
22/12/2025	025-012-018	LS CONSEILS	13/01/2026	1 526,00	1 831,20	0%	5%	98%

REINE

Liste des factures - 13 mars 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
21/12/2025	FA-2025120028	INGEPREV	13/01/2026	5 000,00	6 000,00	0%	17%	61%
30/11/2025	3105	EMPEERING	13/01/2026	14 000,00	16 800,00	0%	3%	43%
18/12/2025	FC-25-12-84	DGM	13/01/2026	18 000,00	21 600,00	0%	4%	90%
15/12/2025	IDC2501864	ID CAPTURE	13/01/2026	405,00	486,00	0%	8%	68%
07/12/2025	54087	BTP Consultant	13/01/2026	2 511,99	3 014,39	0%	5%	58%
22/12/2025	025-012-019	LS CONSEILS	13/01/2026	1 975,00	2 370,00	0%	7%	98%
01/01/2026	Situation 1	LOT 16 - PINSON PAYSAGE	13/02/2026	2 022,62	2 427,14	2%	3%	3%
01/01/2026	Situation 7	LOT 01 - LBC	13/02/2026	149 762,19	179 714,62	7%	7%	66%
01/01/2026	Situation 3	LOT 02 - ODA	13/02/2026	21 863,35	26 236,02	14%	12%	69%
01/01/2026	Situation 5	LOT 03 - VALLEE	13/02/2026	17 213,54	20 656,25	14%	9%	74%
01/01/2026	Situation 9	LOT 12 - CITC	13/02/2026	223 528,83	268 234,60	5%	22%	70%
01/01/2026	Situation 5	LOT 13/14 - EMI	13/02/2026	92 205,12	110 646,14	Caution	16%	58%
01/01/2026	Situation 3	LOT 06/07/08/09/11 - VALLEE	13/02/2026	42 485,87	50 983,05	2%	5%	27%
31/01/2026	Situation 4	CSD	13/02/2026	900,00	1 080,00	0%	5%	30%
10/12/2025	Situation 1 - Phase 2	CSD	13/02/2026	450,00	540,00	0%	2%	30%
30/01/2026	026-001-024	LS CONSEILS	13/02/2026	950,00	1 140,00	0%	100%	100%
06/02/2026	FC-26-02-03	DGM	13/02/2026	2 160,00	2 592,00	0%	1%	90%
07/02/2026	5851	BTP Consultant	13/02/2026	2 225,62	2 670,74	0%	5%	58%
30/01/2026	026-001-022	LS CONSEILS	13/02/2026	2 600,00	3 120,00	0%	19%	100%
23/01/2026	026-001-016	LS CONSEILS	13/02/2026	1 526,00	1 831,20	0%	5%	98%
31/12/2025	3154	EMPEERING	13/02/2026	3 000,00	3 600,00	0%	1%	43%
31/12/2025	3155	EMPEERING	13/02/2026	6 000,00	7 200,00	0%	1%	43%
28/01/2026	NH-2026-0110	ROM	13/02/2026	9 000,00	10 800,00	0%	3%	71%
29/01/2026	3212	EMPEERING	13/02/2026	0,00	0,00	0%	0%	97%
17/12/2025	2025-141	FBDS DESAMIANTAGE	23/02/2026	14 500,00	17 400,00	0%	41%	100%
29/01/2026	2420	SATO	13/03/2026	5 550,00	6 660,00	0%	1%	75%
01/02/2026	165	TECTA	13/03/2026	3 200,00	3 840,00	0%	14%	50%
29/01/2026	3211	EMPEERING	13/03/2026	14 000,00	16 800,00	0%	3%	43%
20/02/2026	FC-26-02-16	DGM	13/03/2026	5 040,00	6 048,00	0%	1%	90%
23/02/2026	026-002-019	LS CONSEILS	13/03/2026	1 975,00	2 370,00	0%	7%	98%
23/02/2026	026-002-020	LS CONSEILS	13/03/2026	2 500,00	3 000,00	0%	9%	98%
01/02/2026	NH-2026-0221	ROM	13/03/2026	18 000,00	21 600,00	0%	6%	71%

REINE

Liste des factures - 13 mars 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
31/12/2025	3156	EMPEERING	13/03/2026	11 000,00	13 200,00	0%	2%	43%
08/01/2026	11581	BTP Consultant	13/03/2026	4 800,00	5 760,00	0%	10%	58%
01/02/2026	Situation 10	LOT 12 - CITC	13/03/2026	111 720,50	134 064,60	Caution	11%	70%
01/03/2026	Situation 6	LOT 13/14 - EMI	13/03/2026	126 544,38	151 853,26	Caution	22%	58%
01/02/2026	Situation 8	LOT 01 - LBC	13/03/2026	57 347,36	68 816,83	7%	3%	66%
01/01/2026	Situation 4	LOT 02 - ODA	13/03/2026	17 692,07	21 230,48	6%	10%	69%
20/02/2026	Situation 6	LOT 03 - VALLEE	13/03/2026	8 082,95	9 699,54	8%	4%	74%
05/03/2026	Situation 3	LOT 05 - 3C CONSTRUCTION	13/03/2026	30 986,18	37 183,41	7%	11%	32%
12/03/2026	IDC2600291	ID CAPTURE	13/03/2026	405,00	486,00	0%	8%	68%
