35ABOND

Bordereau de paiement - 10 avril 26

Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT	TVA	Montant TTC	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
6100348	EAU IDF	10/04/2026	9 982,82	1 996,56	11 979,38	100%	100%
NH-2026-0328	ROM	10/04/2026	4 500,00	900,00	5 400,00	2%	95%
Situation 17	LO6-CITC	10/04/2026	5 617,20	1 123,44	6 740,64	1%	81%
Situation 15	LO6-CITC	10/04/2026	25 702,15	5 140,43	30 842,58	3%	81%
OPC 21	EPOC	10/04/2026	6 460,00	1 292,00	7 752,00	5%	100%
Situation 3	LO4E-DELEBECQUE	10/04/2026	92 914,90	18 582,98	111 497,88	16%	55%
030/2025-26	ECRH	10/04/2026	4 015,82	803,16	4 818,98	2%	39%

179 031,47

Bon à payer

ROM
ROUX ŒUVRE MAITRISE
110 Boulevard Jean Jaurès
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
SAS au capital de 15.000€
RCS Nanterre B 408 566 701
APE 7112B – SIRET 408 566 701 000 53

35ABOND

Tableau récapitulatif du projet - 10 avril 26

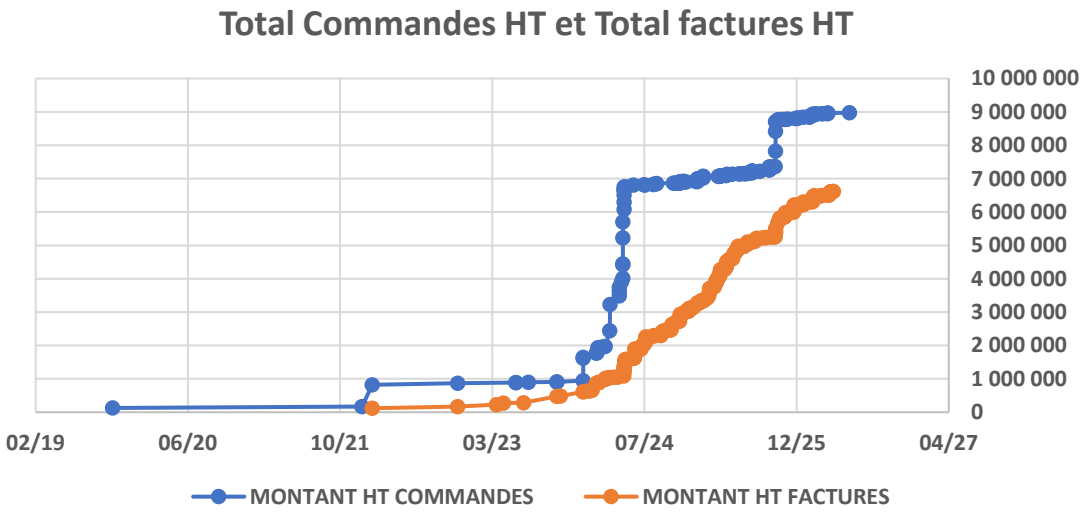

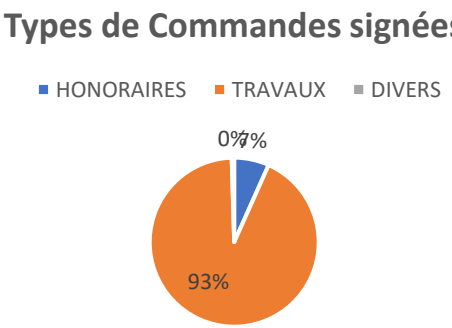

Récapitulatif des dépenses du projet	
Nombre total de commandes	**149**
Nombre total d'avenants	**112**
Nombre de commandes actives	**37**
Nombre total factures	**212**
Montant total commandes (HT)	**8 973 947,45**
Montant total factures (HT)	**6 619 664,45**
Total commandes honoraires (HT)	**600 541,00**
Total commandes travaux (HT)	**8 331 067,01**
Total commandes divers (HT)	**42 339,44**
Total TVA Commandes	**1 686 420,54**
Total TVA factures	**1 214 911,13**
Nombre de factures avec retenue	**94**
Montant total retenue de garantie (HT)	**105 033,52**
Montant total commandes (TTC)	**10 660 367,99**
Montant total factures (TTC)	**7 834 575,58**

Progression du paiement	
% D'avancement - 10 avril 26	**2%**
% D'avancement total	**74%**

Bordereau de transmission

35ABOND

Tableau récapitulatif des commandes (LOTs) - 10 avril 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	**Montant HT**	**LOT**	**Société**	**Montant HT**	**LOT**	**Société**	**Montant HT**	**LOT**
ROM	213 840,00	AMO	LO1-B-SAS CAPELA	34 330,00	LO1-B E - Electricité de chantier	MS CONSEILS	1 105,00	Diagnostic amiante
RBI	9 750,00	BE Fluides	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	941 322,15	LO1-B Travaux généraux	TEAMPROJET	9 490,00	Plateforme de gestion de projet
ECRH	171 471,00	Économiste	LO3-ZILIANI	1 006 253,22	LO3 - GROS ŒUVRE	ARCHISCAN	7 600,00	Géomètre
ARAXE	52 600,00	BET Synthèse	LO4-A-CUILLER	557 310,54	LO4A-CHARPENTE	Orange	8 426,00	Fibre optique
EPOC	123 120,00	OPC	LO4-D-DBS	141 634,20	LO4-D ETANCHEITE	ENEDIS	680,00	Réseaux électricité
Alpha Contrôle	12 000,00	Coordination SPS	LO8-OLEOLIFT	254 641,98	LO8 - ASCENSEURS	Pharmestate	3 415,62	Arrivée d'eau
Alpha Contrôle	15 360,00	Bureau de Contrôle	LO5B-BMA Group	379 072,92	LO5B-Manuiseries interieures	LUSITANIE	1 640,00	Nettoyage
Dear Concept	2 400,00	Coordination VRD	LO5C-BMA Group	256 764,80	LO5C-Sols Faiences	EAU IDF	9 982,82	Arrivée d'eau
			LO5D-BMA Group	232 160,45	LO5D-Cloisons,Doublages,Plaitrerie			
			LO5E-BMA Group	144 882,44	LO5E-Faux plafonds			
			LO4C-SCEIB	131 415,40	LO4C-COUVERTURE			
			LO5F-MAN BATIMENT	131 789,35	LO5F-PEINTURE			
			LO4B-ALPROMETAL	110 595,17	LO4B-FACADES			
			LO4E-ALPROMETAL	403 707,72	LO4E-Menuiseries Extérieures			
			LO5A-ALPROMETAL	27 729,55	LO5A-METALLERIE & SERRURERIE			
			LO6-CITC	867 294,20	LO6-PLOMB,CLIMATISATION			
			LO7-SEGPP	597 484,86	LO7-ELECTRICITE - CFO - CFA - SSI			
			LO2-CBM75	767 644,65	LO2-VRD			
			LO4B-HTPI	464 775,65	LO4B-FACADES2			
			LO4E-DELEBECQUE	595 381,69	LO4E-Menuiseries Extérieures2			
			LO5A-FERMETURE MODERNE	284 876,07	LO5A-METALLERIE & SERRURERIE2			

35ABOND

Tableau récapitulatif des commandes (valeur HT restante) - 10 avril 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	Montant HT	Valeur HT restante	Société	Montant HT	Valeur HT restante	Société	Montant HT	Valeur HT restante
ROM	213 840,00	10 000,00	LO1-B-SAS CAPELA	34 330,00	0,00	MS CONSEILS	1 105,00	1 105,00
RBI	9 750,00	0,00	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	941 322,15	7 326,15	TEAMPROJET	9 490,00	0,00
ECRH	171 471,00	104 035,84	LO3-ZILIANI	1 006 253,22	87 982,86	ARCHISCAN	7 600,00	3 450,00
ARAXE	52 600,00	0,00	LO4-A-CUILLER	557 310,54	29 811,83	Orange	8 426,00	8 426,00
EPOC	123 120,00	0,00	LO4-D-DBS	141 634,20	38 904,80	ENEDIS	680,00	0,00
Alpha Contrôle	12 000,00	12 000,00	LO8-OLEOLIFT	254 641,98	50 824,39	Pharmestate	3 415,62	0,00
Alpha Contrôle	15 360,00	15 360,00	LO5B-BMA Group	379 072,92	263 913,04	LUSITANIE	1 640,00	1 352,00
Dear Concept	2 400,00	2 400,00	LO5C-BMA Group	256 764,80	166 721,55	EAU IDF	9 982,82	0,00
			LO5D-BMA Group	232 160,45	53 514,76			
			LO5E-BMA Group	144 882,44	74 079,95			
			LO4C-SCEIB	131 415,40	24 819,15			
			LO5F-MAN BATIMENT	131 789,35	112 236,45			
			LO4B-ALPROMETAL	110 595,17	0,00			
			LO4E-ALPROMETAL	403 707,72	0,00			
			LO5A-ALPROMETAL	27 729,55	0,00			
			LO6-CITC	867 294,20	161 398,47			
			LO7-SEGPP	597 484,86	274 664,46			
			LO2-CBM75	767 644,65	143 111,08			
			LO4B-HTPI	464 775,65	266 422,13			
			LO4E-DELEBECQUE	595 381,69	268 438,62			
			LO5A-FERMETURE MODERNE	284 876,07	172 528,48			

35ABOND

Tableau récapitulatif des commandes (% d'avancement) - 10 avril 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	Montant HT	% D'avancement	Société	Montant HT	% D'avancement	Société	Montant HT	% D'avancement
ROM	213 840,00	95%	LO1-B-SAS CAPELA	34 330,00	100%	MS CONSEILS	1 105,00	0%
RBI	9 750,00	100%	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	941 322,15	99%	TEAMPROJET	9 490,00	100%
ECRH	171 471,00	39%	LO3-ZILIANI	1 006 253,22	91%	ARCHISCAN	7 600,00	55%
ARAXE	52 600,00	100%	LO4-A-CUILLER	557 310,54	95%	Orange	8 426,00	0%
EPOC	123 120,00	100%	LO4-D-DBS	141 634,20	73%	ENEDIS	680,00	100%
Alpha Contrôle	12 000,00	0%	LO8-OLEOLIFT	254 641,98	80%	Pharmestate	3 415,62	100%
Alpha Contrôle	15 360,00	0%	LO5B-BMA Group	379 072,92	30%	LUSITANIE	1 640,00	18%
Dear Concept	2 400,00	0%	LO5C-BMA Group	256 764,80	35%	EAU IDF	9 982,82	100%
			LO5D-BMA Group	232 160,45	77%			
			LO5E-BMA Group	144 882,44	49%			
			LO4C-SCEIB	131 415,40	81%			
			LO5F-MAN BATIMENT	131 789,35	15%			
			LO4B-ALPROMETAL	110 595,17	100%			
			LO4E-ALPROMETAL	403 707,72	100%			
			LO5A-ALPROMETAL	27 729,55	100%			
			LO6-CITC	867 294,20	81%			
			LO7-SEGPP	597 484,86	54%			
			LO2-CBM75	767 644,65	81%			
			LO4B-HTPI	464 775,65	43%			
			LO4E-DELEBECQUE	595 381,69	55%			
			LO5A-FERMETURE MODERNE	284 876,07	39%			

35ABOND

Liste des factures - 10 avril 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
14/02/2022	Facture Macto-LOT 02	LO2-CBM75	14/02/2022	119 794,43	143 753,32	0%	16%	81%
22/11/2022	Facture 2022 11 102	LO2-CBM75	22/11/2022	50 987,19	61 184,63	5%	7%	81%
29/03/2023	Facture 2023 03 102	LO2-CBM75	29/03/2023	61 572,02	73 886,42	5%	8%	81%
21/04/2023	Facture 2023 04 100	LO2-CBM75	21/04/2023	46 959,90	56 351,87	5%	6%	81%
26/06/2023	Facture 2023 06 104	LO2-CBM75	26/06/2023	5 454,20	6 545,04	5%	1%	81%
14/10/2023	Demande Avance	LO2-CBM75	14/10/2023	187 702,11	225 242,53	0%	24%	81%
08/01/2024	YTS -1	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	08/01/2024	129 642,14	155 570,57	0%	14%	99%
22/01/2024	OPC 1	EPOC	22/01/2024	18 240,00	21 888,00	0%	15%	100%
30/01/2024	027/2023-24	ECRH	30/01/2024	2 007,91	2 409,49	0%	1%	39%
20/02/2024	YTS -2	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	20/02/2024	209 470,02	251 364,02	0%	22%	99%
25/02/2024	NH / 2024 / 018	ROM	25/02/2024	24 000,00	28 800,00	0%	11%	95%
29/02/2024	028/2023-24	ECRH	29/02/2024	2 007,91	2 409,49	0%	1%	39%
29/02/2024	OPC 2	EPOC	29/02/2024	6 080,00	7 296,00	0%	5%	100%
20/03/2024	YTS -3	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	20/03/2024	89 262,66	107 115,19	0%	9%	99%
21/03/2024	Facture 2024 03 103	LO2-CBM75	21/03/2024	31 083,90	37 300,68	5%	4%	81%
25/10/2023	N°2023-4654	RBI	09/04/2024	9 750,00	11 700,00	0%	100%	100%
05/04/2024	24-04-751	TEAMPROJET	15/05/2024	6 570,00	7 884,00	0%	69%	100%
22/05/2024	20245723	LO5C-BMA Group	06/06/2024	65 308,10	78 369,72	0%	25%	35%
22/05/2024	20245724	LO5D-BMA Group	06/06/2024	64 504,16	77 404,99		28%	77%
22/05/2024	20245725	LO5E-BMA Group	06/06/2024	42 136,33	50 563,60	0%	29%	49%
25/05/2024	NH / 2024 / 046	ROM	06/06/2024	24 000,00	28 800,00	0%	11%	95%
09/01/2024	2024/0012 du	LO1-B-SAS CAPELA	06/06/2024	6 866,00	8 239,20	0%	20%	100%
06/02/2024	2024/0025 du	LO1-B-SAS CAPELA	06/06/2024	17 165,00	20 598,00	0%	50%	100%
25/05/2024	YTS -4	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	06/06/2024	30 495,63	36 594,76	0%	3%	99%
18/04/2024	2024/0064 du	LO1-B-SAS CAPELA	06/06/2024	10 299,00	12 358,80	0%	30%	100%
22/05/2024	20245722	LO5B-BMA Group	06/06/2024	111 834,88	134 201,86		30%	30%
20/05/2024	OS n° 2-L01-B	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	12/07/2024	32 843,00	39 411,60	0%	3%	99%
24/05/2024	OS n° 4-L01-B	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	12/07/2024	22 500,00	27 000,00	0%	2%	99%
24/05/2024	OS n° 3-L01-B	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	12/07/2024	121 657,00	145 988,40	0%	13%	99%
30/03/2024	033/2023-24	ECRH	12/07/2024	2 007,91	2 409,49	0%	1%	39%
30/05/2024	042/2023-24	ECRH	12/07/2024	2 007,91	2 409,49	0%	1%	39%
30/03/2024	032/2023-24	ECRH	12/07/2024	14 929,50	17 915,40	0%	9%	39%

35ABOND

Liste des factures - 10 avril 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
30/04/2024	038/2023-24	ECRH	12/07/2024	2 007,91	2 409,49	0%	1%	39%
23/05/2024	Facture 2024 05 107	LO2-CBM75	12/07/2024	15 493,41	18 592,09	5%	2%	81%
24/06/2024	FA240127	ARCHISCAN	12/07/2024	700,00	840,00	0%	9%	55%
24/06/2024	FA240125	ARCHISCAN	12/07/2024	3 450,00	4 140,00	0%	45%	55%
20/06/2024	YTS -5	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	12/07/2024	27 649,00	33 178,80	0%	3%	99%
26/07/2024	1 2 0 2	ARAXE	02/08/2024	6 500,00	7 800,00	0%	12%	100%
20/06/2024	OS n° 5-L01-B	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	02/08/2024	14 000,00	16 800,00	0%	1%	99%
20/07/2024	YTS -6	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	02/08/2024	113 199,60	135 839,52	0%	12%	99%
30/06/2024	051/2023-24	ECRH	02/08/2024	2 007,91	2 409,49	0%	1%	39%
16/07/2024	Situation 1	LO4-A-CUILLER	22/10/2024	1 875,00	2 250,00	Caution	0%	95%
30/07/2024	OPC 3	EPOC	22/10/2024	6 080,00	7 296,00	0%	5%	100%
30/09/2024	OPC 4	EPOC	22/10/2024	6 080,00	7 296,00	0%	5%	100%
26/09/2024	1 2 0 6	ARAXE	22/10/2024	6 500,00	7 800,00	0%	12%	100%
26/08/2024	1 2 0 4	ARAXE	22/10/2024	6 500,00	7 800,00	0%	12%	100%
01/08/2024	Situation 1	LO4B-ALPROMETAL	22/10/2024	41 450,40	41 450,40	5%	37%	100%
01/08/2024	Situation 1	LO4E-ALPROMETAL	22/10/2024	78 103,30	78 103,30	5%	19%	100%
01/08/2024	Situation 1	LO5A-ALPROMETAL	22/10/2024	27 729,55	27 729,55	5%	100%	100%
25/06/2024	Situation 3	LO3-ZILIANI	22/10/2024	214 770,53	257 724,64	5%	21%	91%
29/07/2024	Situation 1	LO6-CITC	22/10/2024	76 983,81	92 380,57	Caution	9%	81%
30/09/2024	Situation 2	LO6-CITC	22/10/2024	16 938,63	20 326,36	Caution	2%	81%
25/06/2024	Situation 1	LO3-ZILIANI	22/10/2024	48 828,01	58 593,62	5%	5%	91%
25/08/2024	NH / 2024 / 106	ROM	22/10/2024	24 000,00	28 800,00	0%	11%	95%
25/07/2024	Situation 2	LO3-ZILIANI	22/10/2024	9 807,23	11 768,68	5%	1%	91%
01/08/2024	Situation 2	LO4-A-CUILLER	22/10/2024	1 875,00	2 250,00	Caution	0%	95%
19/09/2024	Situation 3	LO4-A-CUILLER	19/11/2024	1 875,00	2 250,00	Caution	0%	95%
25/10/2024	NH / 2024 / 142	ROM	19/11/2024	16 000,00	19 200,00	0%	7%	95%
25/09/2024	YTS -7	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	19/11/2024	10 450,00	12 540,00	0%	1%	99%
24/09/2024	Facture 2024 09 101	LO2-CBM75	19/11/2024	105 486,42	126 583,71	5%	14%	81%
30/10/2024	OPC 5	EPOC	19/11/2024	4 560,00	5 472,00	0%	4%	100%
23/10/2024	1 2 0 7	ARAXE	19/11/2024	6 500,00	7 800,00	0%	12%	100%
25/10/2024	Situation 4	LO3-ZILIANI	19/11/2024	141 365,49	169 638,59	5%	14%	91%
18/10/2024	Situation 3	LO6-CITC	19/11/2024	21 936,60	26 323,92	Caution	3%	81%

35ABOND

Liste des factures - 10 avril 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
29/11/2024	Situation 1	LO7-SEGPP	12/12/2024	8 083,79	9 700,54	5%	1%	54%
22/11/2024	Situation 5	LO3-ZILIANI	12/12/2024	109 820,36	131 784,43	5%	11%	91%
30/11/2024	1 2 1 0	ARAXE	12/12/2024	6 500,00	7 800,00	0%	12%	100%
30/11/2024	OPC 6	EPOC	12/12/2024	3 800,00	4 560,00	0%	3%	100%
18/11/2024	Situation 4	LO4-A-CUILLER	12/12/2024	40 106,07	48 127,28	Caution	7%	95%
19/11/2024	Situation 2	LO4B-ALPROMETAL	12/12/2024	117,86	117,86	5%	0%	100%
19/11/2024	Situation 2	LO4E-ALPROMETAL	12/12/2024	95 266,95	95 266,95	5%	24%	100%
31/07/2024	001/2024-25	ECRH	16/01/2025	2 007,91	2 409,49	0%	1%	39%
31/08/2024	002/2024-25	ECRH	16/01/2025	2 007,91	2 409,49	0%	1%	39%
30/11/2024	005/2024-25	ECRH	16/01/2025	6 023,73	7 228,48	0%	4%	39%
30/12/2024	013/2024-25	ECRH	16/01/2025	2 007,91	2 409,49	0%	1%	39%
31/12/2024	OPC 7	EPOC	16/01/2025	3 800,00	4 560,00	0%	3%	100%
12/12/2024	Situation 5	LO4-A-CUILLER	16/01/2025	70 117,13	84 140,56	Caution	13%	95%
07/01/2025	YTS -8	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	16/01/2025	23 485,50	28 182,60	0%	2%	99%
04/11/2024	Situation 4	LO6-CITC	16/01/2025	54 332,68	65 199,22	Caution	6%	81%
20/12/2024	OS n° 7-L01-B	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	16/01/2025	2 830,00	3 396,00	0%	0%	99%
25/12/2024	NH / 2024 / 185	ROM	16/01/2025	18 560,00	22 272,00	0%	9%	95%
31/01/2025	1 2 1 7	ARAXE	10/02/2025	6 000,00	7 200,00	0%	11%	100%
31/01/2025	1 2 1 8	ARAXE	10/02/2025	3 800,00	4 560,00	0%	7%	100%
25/01/2025	NH / 2025 / 001	ROM	10/02/2025	10 000,00	12 000,00	0%	5%	95%
24/01/2025	OS n° 8-L01-B	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	10/02/2025	1 610,00	1 932,00	0%	0%	99%
31/01/2025	OPC 8	EPOC	18/02/2025	3 800,00	4 560,00	0%	3%	100%
20/12/2024	Situation 6	LO3-ZILIANI	18/02/2025	71 797,80	86 157,36	5%	7%	91%
29/01/2025	Situation 7	LO3-ZILIANI	18/02/2025	41 535,33	49 842,40	5%	4%	91%
17/01/2025	Situation 6	LO4-A-CUILLER	18/02/2025	117 038,99	140 446,79	Caution	21%	95%
14/02/2025	Situation 1	LO8-OLEOLIFT	18/02/2025	65 833,08	78 999,70	5%	26%	80%
28/02/2025	OPC 9	EPOC	12/03/2025	5 320,00	6 384,00	0%	4%	100%
20/02/2025	YTS -9	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	12/03/2025	13 015,00	15 618,00	0%	1%	99%
26/02/2025	Situation 7	LO4-A-CUILLER	12/03/2025	123 211,81	147 854,17	Caution	22%	95%
07/02/2025	Situation 1	LO4-D-DBS	12/03/2025	4 250,43	5 100,52	0%	3%	73%
25/02/2025	Situation 3	LO4E-ALPROMETAL	12/03/2025	76 594,22	76 594,22	5%	19%	100%
25/03/2025	NH / 2025 / 013	ROM	10/04/2025	10 000,00	12 000,00	0%	5%	95%

35ABOND

Liste des factures - 10 avril 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
31/03/2025	015/2024-25	ECRH	10/04/2025	6 023,73	7 228,48	0%	4%	39%
31/03/2025	OPC 10	EPOC	10/04/2025	6 080,00	7 296,00	0%	5%	100%
20/03/2025	YTS -10	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	10/04/2025	7 640,00	9 168,00	0%	1%	99%
24/02/2025	Situation 8	LO3-ZILIANI	10/04/2025	80 162,82	96 195,40	5%	8%	91%
20/03/2025	Situation 8	LO4-A-CUILLER	10/04/2025	79 204,31	95 045,17	Caution	14%	95%
14/03/2025	Situation 3	LO4B-ALPROMETAL	10/04/2025	44 710,23	44 744,43	5%	40%	100%
04/04/2025	Situation 4	LO4B-ALPROMETAL	10/04/2025	15 701,43	15 704,77	5%	14%	100%
03/04/2025	Situation 2	LO4-D-DBS	10/04/2025	75 934,83	91 121,79	0%	54%	73%
17/03/2025	Situation 5	LO6-CITC	10/04/2025	111 676,53	134 011,84	Caution	13%	81%
31/12/2024	1 2 1 4	ARAXE	07/05/2025	6 500,00	7 800,00	0%	12%	100%
31/12/2024	1 2 1 5	ARAXE	07/05/2025	3 800,00	4 560,00	0%	7%	100%
24/03/2025	Situation 9	LO3-ZILIANI	07/05/2025	17 502,38	21 002,86	5%	2%	91%
17/03/2025	Situation 4	LO4E-ALPROMETAL	07/05/2025	5 920,40	5 920,40	5%	1%	100%
31/03/2025	Situation 6	LO6-CITC	07/05/2025	56 642,68	67 971,22	Caution	7%	81%
23/04/2025	Situation 2	LO7-SEGPP	07/05/2025	69 005,41	82 806,50	Caution	12%	54%
22/04/2025	Situation 2	LO8-OLEOLIFT	07/05/2025	69 107,41	82 928,89	Caution	27%	80%
22/04/2025	YTS -11	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	07/05/2025	7 640,00	9 168,00	0%	1%	99%
31/05/2025	OPC 12	EPOC	12/06/2025	3 800,00	4 560,00	0%	3%	100%
30/04/2025	OPC 11	EPOC	12/06/2025	5 320,00	6 384,00	0%	4%	100%
28/03/2025	Situation 10	LO3-ZILIANI	12/06/2025	77 557,87	93 069,43	5%	8%	91%
28/05/2025	Situation 11	LO3-ZILIANI	12/06/2025	11 400,55	13 680,66	5%	1%	91%
18/04/2025	Situation 9	LO4-A-CUILLER	12/06/2025	10 863,41	13 036,09	Caution	2%	95%
23/04/2025	Situation 5	LO4B-ALPROMETAL	12/06/2025	8 615,25	8 615,25	5%	8%	100%
22/04/2025	Situation 1	LO4C-SCEIB	12/06/2025	34 906,32	41 887,58	5%	27%	81%
25/05/2025	Situation 2	LO4C-SCEIB	12/06/2025	71 689,94	86 027,92	5%	55%	81%
24/04/2025	Situation 3	LO4-D-DBS	12/06/2025	22 544,15	27 052,98	0%	16%	73%
17/05/2025	Situation 5	LO4E-ALPROMETAL	12/06/2025	147 822,85	147 822,85	5%	37%	100%
30/04/2025	Situation 7	LO6-CITC	12/06/2025	48 592,11	58 310,53	Caution	6%	81%
31/05/2025	Situation 8	LO6-CITC	12/06/2025	92 466,67	110 960,00	Caution	11%	81%
03/04/2025	Situation 3	LO7-SEGPP	12/06/2025	51 787,32	62 144,78	Caution	9%	54%
13/05/2025	Situation 4	LO7-SEGPP	12/06/2025	29 303,36	35 164,04	Caution	5%	54%
24/04/2025	Situation 3	LO8-OLEOLIFT	12/06/2025	17 829,09	21 394,91	Caution	7%	80%

35ABOND

Liste des factures - 10 avril 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
23/05/2025	Situation 4	LO8-OLEOLIFT	12/06/2025	32 025,04	38 430,04	Caution	13%	80%
30/05/2025	NH-2025-058	ROM	12/06/2025	10 000,00	12 000,00	0%	5%	95%
15/06/2025	1004	ENEDIS	15/06/2025	680,00	816,00	0%	100%	100%
20/06/2025	OS n° 9-L01-B	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	11/07/2025	2 720,00	3 264,00	0%	0%	99%
20/06/2025	OS n° 10-L01-B	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	11/07/2025	4 280,00	5 136,00	0%	0%	99%
30/06/2025	OPC 13	EPOC	11/07/2025	5 320,00	6 384,00	0%	4%	100%
31/07/2025	Situation 1	LO5D-BMA Group	31/07/2025	15 340,25	18 408,30	22%	7%	77%
30/07/2025	Situation 1	LO5F-MAN BATIMENT	31/07/2025	7 585,75	9 102,90	5%	6%	15%
30/06/2025	Situation 9	LO6-CITC	31/07/2025	22 388,12	26 212,95	Caution	3%	81%
30/06/2025	Situation 5	LO7-SEGPP	31/07/2025	33 411,00	40 093,20	Caution	6%	54%
25/06/2025	Situation 5	LO8-OLEOLIFT	31/07/2025	19 022,98	22 827,58	Caution	7%	80%
25/06/2025	Situation 12	LO3-ZILIANI	31/07/2025	33 074,69	39 689,62	5%	3%	91%
01/08/2025	NH-2025-0838	ROM	10/09/2025	10 000,00	12 000,00	0%	5%	95%
28/08/2025	OPC 14	EPOC	10/09/2025	6 840,00	8 208,00	0%	6%	100%
25/07/2025	Situation 15	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	10/09/2025	22 920,00	27 504,00	0%	2%	99%
20/08/2025	Situation 16	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	10/09/2025	7 640,00	9 168,00	0%	1%	99%
25/07/2025	Situation 13	LO3-ZILIANI	10/09/2025	17 465,60	20 958,72	5%	2%	91%
28/07/2025	Situation 2	LO5F-MAN BATIMENT	10/09/2025	11 967,15	14 360,58	5%	9%	15%
29/07/2025	Situation 10	LO6-CITC	10/09/2025	5 818,00	6 981,60	Caution	1%	81%
29/07/2025	Situation 6	LO7-SEGPP	10/09/2025	27 058,12	32 469,74	Caution	5%	54%
29/09/2025	NH-2025-0964	ROM	09/10/2025	10 000,00	12 000,00	0%	5%	95%
16/07/2025	2025-ABD-009	Pharmestate	09/10/2025	3 415,62	4 098,74	0%	100%	100%
20/09/2025	Situation n° 17	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	09/10/2025	7 640,00	9 168,00	0%	1%	99%
30/09/2025	OPC 15	EPOC	09/10/2025	6 840,00	8 208,00	0%	6%	100%
15/10/2025	Situation 0	LO4B-HTPI	27/10/2025	139 432,70	167 319,24	0%	30%	43%
08/10/2025	Situation 0	LO4E-DELEBECQUE	27/10/2025	178 614,51	214 337,41	Caution	30%	55%
30/09/2025	Situation 0	LO5A-FERMETURE MODERNE	27/10/2025	85 462,82	102 555,38		30%	39%
24/10/2025	NH-2025-1079	ROM	10/11/2025	16 500,00	19 800,00	0%	8%	95%
03/11/2025	Situation 10	LO4-A-CUILLER	10/11/2025	7 154,45	8 585,34	Caution	1%	95%
03/11/2025	Situation 2	LO5D-BMA Group	10/11/2025	10 170,23	12 204,27	5%	4%	77%
03/11/2025	Situation 11	LO6-CITC	10/11/2025	23 346,80	28 016,16	Caution	3%	81%
03/11/2025	Situation 12	LO6-CITC	10/11/2025	10 863,15	13 035,78	Caution	1%	81%

35ABOND

Liste des factures - 10 avril 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
03/11/2025	Situation 14	LO3-ZILIANI	10/11/2025	35 151,35	42 181,62	5%	3%	91%
23/10/2025	Situation n° 18	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	10/11/2025	8 486,45	10 183,74	0%	1%	99%
16/10/2025	25-10-925	TEAMPROJET	10/11/2025	2 190,00	2 628,00	0%	23%	100%
30/08/2025	00A/2025-26	ECRH	05/12/2025	2 007,91	2 409,49	0%	1%	39%
30/09/2025	001A/2025-26	ECRH	05/12/2025	2 007,91	2 409,49	0%	1%	39%
30/10/2025	007/2025-26	ECRH	05/12/2025	2 007,91	2 409,49	0%	1%	39%
30/11/2025	011/2025-26	ECRH	05/12/2025	2 007,91	2 409,49	0%	1%	39%
01/07/2025	028/2024-25	ECRH	05/12/2025	4 015,82	4 818,98	0%	2%	39%
30/07/2025	031/2024-25	ECRH	05/12/2025	2 007,91	2 409,49	0%	1%	39%
01/10/2025	Situation 15	LO3-ZILIANI	05/12/2025	8 030,34	9 636,41	5%	1%	91%
01/10/2025	Situation 1	LO5C-BMA Group	05/12/2025	24 735,15	29 682,18	5%	10%	35%
01/10/2025	Situation 3	LO5D-BMA Group	05/12/2025	40 701,75	48 842,10	5%	18%	77%
20/11/2025	Situation n° 19	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	05/12/2025	7 640,00	9 168,00	0%	1%	99%
31/10/2025	OPC 16	EPOC	05/12/2025	6 080,00	7 296,00	0%	5%	100%
30/11/2025	OPC 17	EPOC	05/12/2025	4 560,00	5 472,00	0%	4%	100%
25/10/2025	NH-2025-1186	ROM	05/12/2025	9 000,00	10 800,00	0%	4%	95%
12/11/2025	NH-2025-1183	ROM	05/12/2025	2 280,00	2 736,00	0%	1%	95%
23/12/2025	Situation n° 20	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	13/01/2026	7 640,00	9 168,00	0%	1%	99%
31/12/2025	OPC 18	EPOC	13/01/2026	4 560,00	5 472,00	0%	4%	100%
31/12/2025	NH-2025-12101	ROM	13/01/2026	5 000,00	6 000,00	0%	2%	95%
10/12/2025	25-12-939	TEAMPROJET	13/01/2026	730,00	876,00	0%	8%	100%
01/10/2025	Situation 11	LO4-A-CUILLER	13/01/2026	74 177,54	89 013,05	Caution	13%	95%
01/11/2025	Situation 13	LO6-CITC	13/01/2026	16 611,50	19 933,80	Caution	2%	81%
05/02/2026	023/2025-26	ECRH	13/02/2026	4 015,82	4 818,98	0%	2%	39%
05/02/2026	024/2025-26	ECRH	13/02/2026	300,00	360,00	0%	0%	39%
31/01/2026	OPC 19	EPOC	13/02/2026	3 800,00	4 560,00	0%	3%	100%
20/01/2026	Situation n° 21	LO1-B-1-YVELINES TRAVAUX	13/02/2026	7 640,00	9 168,00	0%	1%	99%
01/12/2025	Situation 1	LO4B-HTPI	13/02/2026	23 867,13	28 640,55	5%	5%	43%
01/11/2025	Situation 4	LO5D-BMA Group	13/02/2026	25 508,45	30 610,14	5%	11%	77%
01/12/2025	Situation 1	LO5E-BMA Group	13/02/2026	9 197,87	11 037,44	5%	6%	49%
01/12/2025	Situation 2	LO5E-BMA Group	13/02/2026	15 261,69	18 314,03	5%	11%	49%
01/12/2025	Situation 14	LO6-CITC	13/02/2026	95 556,30	114 667,56	Caution	11%	81%

35ABOND

Liste des factures - 10 avril 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
01/12/2025	Situation 7	LO7-SEGPP	13/02/2026	39 077,00	46 892,40	Caution	7%	54%
28/01/2026	NH-2026-019	ROM	13/02/2026	5 000,00	6 000,00	0%	2%	95%
27/02/2026	NH-2026-0220	ROM	12/03/2026	5 000,00	6 000,00	0%	2%	95%
28/02/2026	260252614	LUSITANIE	12/03/2026	288,00	345,60	0%	18%	18%
27/02/2026	OPC 20	EPOC	12/03/2026	5 700,00	6 840,00	0%	5%	100%
01/01/2026	Situation 2	LO4B-HTPI	12/03/2026	35 053,70	42 064,43	5%	8%	43%
01/02/2026	Situation 1	LO4E-DELEBECQUE	12/03/2026	55 413,66	66 496,39	Caution	9%	55%
01/01/2026	Situation 1	LO5A-FERMETURE MODERNE	12/03/2026	26 884,77	32 261,72	5%	9%	39%
01/01/2026	Situation 1	LO5B-BMA Group	12/03/2026	3 325,00	3 990,00	5%	1%	30%
01/12/2025	Situation 5	LO5D-BMA Group	12/03/2026	22 420,86	26 905,02	5%	10%	77%
01/02/2026	Situation 16	LO6-CITC	12/03/2026	20 966,80	25 160,16	Caution	2%	81%
01/02/2026	Situation 8	LO7-SEGPP	12/03/2026	65 094,40	78 113,28	Caution	11%	54%
01/01/2026	Situation 3	LO5E-BMA Group	12/03/2026	4 206,60	5 047,92	5%	3%	49%
23/03/2026	6100348	EAU IDF	10/04/2026	9 982,82	11 979,38	0%	100%	100%
27/03/2026	NH-2026-0328	ROM	10/04/2026	4 500,00	5 400,00	0%	2%	95%
09/04/2026	Situation 17	LO6-CITC	10/04/2026	5 617,20	6 740,64	Caution	1%	81%
04/02/2026	Situation 15	LO6-CITC	10/04/2026	25 702,15	30 842,58	Caution	3%	81%
31/03/2026	OPC 21	EPOC	10/04/2026	6 460,00	7 752,00	0%	5%	100%
30/03/2026	Situation 3	LO4E-DELEBECQUE	10/04/2026	92 914,90	111 497,88	Caution	16%	55%
07/04/2026	030/2025-26	ECRH	10/04/2026	4 015,82	4 818,98	0%	2%	39%
