42RBOUL

Bordereau de paiement - 10 avril 26

Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT	TVA	Montant TTC	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
3269	EMPEERING	10/04/2026	14 000,00	2 800,00	16 800,00	4%	33%
026-003-020	LS CONSEILS - MOE	10/04/2026	4 712,50	942,50	5 655,00	33%	100%
026-003-021	LS CONSEILS - CSPS	10/04/2026	2 250,00	450,00	2 700,00	31%	69%
IDC2600468	ID Capture	10/04/2026	450,00	90,00	540,00	10%	10%

25 695,00

Bon à payer

ROM
ROUX ŒUVRE MAITRISE
110 Boulevard Jean Jaurès
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
SAS au capital de 15.000€
RCS Nanterre B 408 566 701
APE 7112B – SIRET 408 566 701 000 53

42RBOUL

Tableau récapitulatif du projet - 10 avril 26

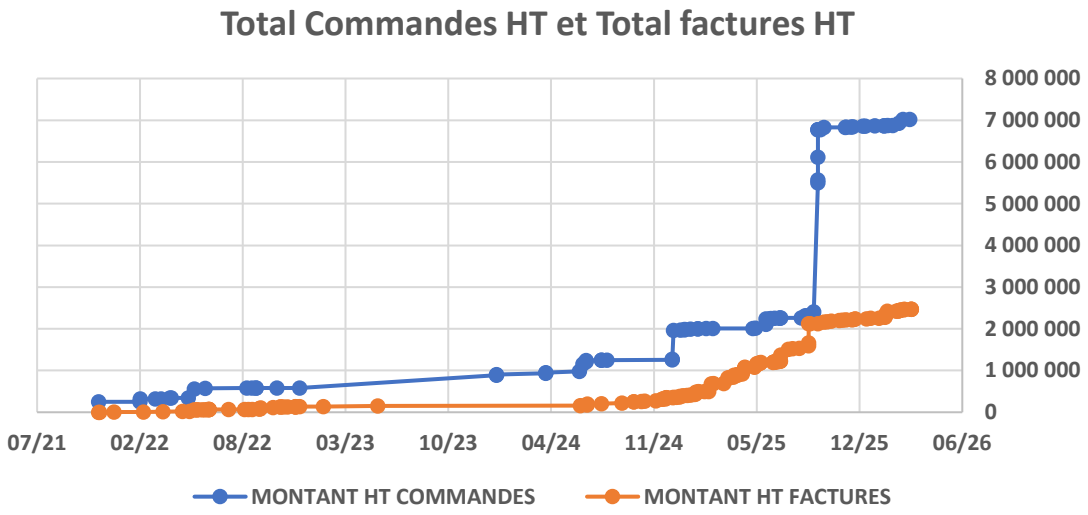

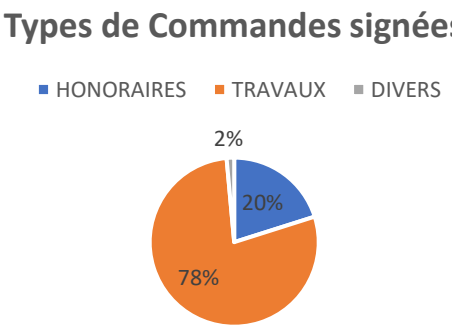

Récapitulatif des dépenses du projet	
Nombre total de commandes	**76**
Nombre total d'avenants	**37**
Nombre de commandes actives	**39**
Nombre total factures	**139**
Montant total commandes (HT)	**7 022 713,46**
Montant total factures (HT)	**2 472 844,23**
Total commandes honoraires (HT)	**1 412 674,00**
Total commandes travaux (HT)	**5 508 600,81**
Total commandes divers (HT)	**101 438,65**
Total TVA Commandes	**1 404 542,69**
Total TVA factures	**493 916,85**
Nombre de factures avec retenue	**5**
Montant total retenue de garantie (HT)	**0,00**
Montant total commandes (TTC)	**8 427 256,15**
Montant total factures (TTC)	**2 966 761,08**

Progression du paiement	
% D'avancement - 10 avril 26	**0%**
% D'avancement total	**35%**

Bordereau de transmission

42RBOUL

Tableau récapitulatif des commandes (LOTs) - 10 avril 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	**Montant HT**	**LOT**	**Société**	**Montant HT**	**LOT**	**Société**	**Montant HT**	**LOT**
ROM	269 500,00	AMO	LOT 00 - 4D DEMOLITION	987 193,24	CURAGE-DEPOL.-DEMOL.	PIC 92	401,65	AFFICHAGE PC
HAME	255 000,00	ARCHITECTE	LOT 01/02A/02B/03/04 - GAGNERAUD	3 250 285,01	CHANT./GROSS ŒUVRE/	PRIMUS DIAG	14 750,00	Sondages
DAL	78 000,00	Economiste	LOT 05 - ORONA	65 500,00	ASCENSEURS	OASIIS	25 000,00	Frais Certificateurs
SOCOTEC	55 500,00	Bureau de Contrôle et CS	LOT 16 - GREENWORKS	542 622,56	ÉLECTRICITÉ	EXIM	3 420,00	Diagnostic amiante
CERQUAL	8 109,00	Certificateur	LOT 15 - FERN ENERGIES	663 000,00	CVC/PLB	GE3D Paris	23 733,00	Géomètre
GEOLIA	24 525,00	BET Géotechnique				BC2E	900,00	Examen Amiante
META Acoustique	20 050,00	BET Acoustique				ENEZ SUN	18 960,00	Marketing
PAX	188 460,00	BET Struct. et fluid.				VAIGO	434,00	Analyses des eaux
OASIIS	61 200,00	AMO ENVIRONNEMENT				ID Capture	4 600,00	Plateforme
Galéna Conseil	35 000,00	MOE curage / dépollution				LS CONSEILS	9 240,00	Diagnostic plomb
EMPEERING	323 000,00	MOEx OPC						
STRUCTURA - LAB	63 500,00	BET Structure						
PRESTATERRE	4 830,00	Certification énergétique						
LS CONSEILS - MOE	14 500,00	MOE dépollution						
SYMBIOSE	4 300,00	BE Structure 2						
LS CONSEILS - CSPS	7 200,00	CSPS						

42RBOUL

Tableau récapitulatif des commandes (valeur HT restante) - 10 avril 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	**Montant HT**	**Valeur HT rest.**	**Société**	**Montant HT**	**Valeur HT rest.**	**Société**	**Montant HT**	**Valeur HT rest.**
ROM	269 500,00	108 900,00	LOT 00 - 4D DEMOLITION	987 193,24	62 370,00	PIC 92	401,65	208,86
HAME	255 000,00	82 543,33	LOT 01/02A/02B/03/04 - GAGNERAUD	3 250 285,01	2 672 328,65	PRIMUS DIAG	14 750,00	0,00
DAL	78 000,00	0,00	LOT 05 - ORONA	65 500,00	65 500,00	OASIIS	25 000,00	20 073,46
SOCOTEC	55 500,00	31 136,89	LOT 16 - GREENWORKS	542 622,56	488 360,30	EXIM	3 420,00	0,00
CERQUAL	8 109,00	6 494,25	LOT 15 - FERN ENERGIES	663 000,00	590 842,82	GE3D Paris	23 733,00	23 733,00
GEOLIA	24 525,00	8 675,00				BC2E	900,00	300,00
META Acoustique	20 050,00	11 800,00				ENEZ SUN	18 960,00	12 987,00
PAX	188 460,00	51 425,00				VAIGO	434,00	434,00
OASIIS	61 200,00	24 800,00				ID Capture	4 600,00	4 150,00
Galéna Conseil	35 000,00	0,00				LS CONSEILS	9 240,00	1 500,00
EMPEERING	323 000,00	217 000,00						
STRUCTURA - LAB	63 500,00	57 175,00						
PRESTATERRE	4 830,00	2 415,00						
LS CONSEILS - MOE	14 500,00	0,00						
SYMBIOSE	4 300,00	3 010,00						
LS CONSEILS - CSPS	7 200,00	2 250,00						

42RBOUL

Tableau récapitulatif des commandes (% d'avancement) - 10 avril 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	**Montant HT**	**% D'avancement**	**Société**	**Montant HT**	**% D'avancement**	**Société**	**Montant HT**	**% D'avancement**
ROM	269 500,00	60%	LOT 00 - 4D DEMOLITION	987 193,24	94%	PIC 92	401,65	48%
HAME	255 000,00	68%	LOT 01/02A/02B/03/04 - GAGNERAUD	3 250 285,01	18%	PRIMUS DIAG	14 750,00	100%
DAL	78 000,00	100%	LOT 05 - ORONA	65 500,00	0%	OASIIS	25 000,00	20%
SOCOTEC	55 500,00	44%	LOT 16 - GREENWORKS	542 622,56	10%	EXIM	3 420,00	100%
CERQUAL	8 109,00	20%	LOT 15 - FERN ENERGIES	663 000,00	11%	GE3D Paris	23 733,00	0%
GEOLIA	24 525,00	65%				BC2E	900,00	67%
META Acoustique	20 050,00	41%				ENEZ SUN	18 960,00	32%
PAX	188 460,00	73%				VAIGO	434,00	0%
OASIIS	61 200,00	59%				ID Capture	4 600,00	10%
Galéna Conseil	35 000,00	100%				LS CONSEILS	9 240,00	84%
EMPEERING	323 000,00	33%						
STRUCTURA - LAB	63 500,00	10%						
PRESTATERRE	4 830,00	50%						
LS CONSEILS - MOE	14 500,00	100%						
SYMBIOSE	4 300,00	30%						
LS CONSEILS - CSPS	7 200,00	69%						

	CONCEPTION					EXECUTION			
Estimation	Programme	APS	APD	DCE Ind. 1		Entreprise	MARCHE	TS	
Intitulés	Total HT	Total HT	Total HT	Total HT			Total HT	Total HT	
Travaux									
Lot 00 - Démolition, Curage et Dépollution				809 960,91		LOT 00 - 4D DEMOLITION	690 620,00		296 573,24
Lot 01 - Installation de chantier				838 015,82		LOT 01/02A/02B/03/04 - GAGNERAUD	3 098 567,96		151 717,05
Lot 02 - Demolitions compl.VRD				2 161 248,00			inc	inc	
Lot 03 - Chapante bois				65 323,00			inc	inc	
Lot 04 - Etanchéité - Couverture				201 226,00			inc	inc	
Lot 05A/05B - Menuiseries Extérieures				335 000,00		non attribué	335 000,00		
Lot 05C - Mur rideau				79 000,00		non attribué	79 000,00		
Lot 06 - Façades				259 000,00		non attribué	259 000,00		
Lot 07 - Cloisons				250 000,00		non attribué	250 000,00		
Lot 08 - Menuiserie intérieure				242 000,00		non attribué	242 000,00		
Lot 09 - Metallerie				320 000,00		non attribué	320 000,00		
Lot 10 - Chapes				32 000,00		non attribué	32 000,00		
Lot 11 - Revetements durs				111 000,00		non attribué	111 000,00		
Lot 12 - Revetements de sols				25 000,00		non attribué	25 000,00		
Lot 13 - Parquet				67 000,00		non attribué	67 000,00		
Lot 14 - Peinture				151 000,00		non attribué	151 000,00		
Lot 15A/15B - CVCD				663 000,00		LOT 15 - FERN ENERGIES	663 000,00		-
Lot 16A/16B - CFO/CFA				542 623,00		LOT 16 - GREENWORKS	542 622,56		-
Lot 17 - Ascenseurs				65 500,00		LOT 05 - ORONA	65 500,00		-
Lot 18 - VRD				321 000,00		non attribué	321 000,00		
Lot XX - Reprises bois				150 000,00					
Sous-total travaux 1	0,00	0,00	0,00	7 688 896,73			7 252 310,52		448 290,29
Imprévus	0,00	0,00	0,00	463 213,70					

	CONCEPTION					EXECUTION		
	Programme	APS	APD	DCE Ind. 1		Entreprise	MARCHE	TS
Diagnostics complémentaires				40 000,00		STRUCTURA - LAB	4 000,00	59 500,00
						EXIM	2 880,00	540,00
						PRIMUS DIAG	10 550,00	4 200,00
						VAIGO	434,00	-
						SYMBIOSE	4 300,00	-
Sous-total travaux 2	0,00	0,00	0,00	8 192 110,43			7 274 474,52	512 530,29
Architecte				188 000,00		HAME	250 000,00	5 000,00
BET Multitech				262 920,00		PAX	170 000,00	18 460,00
Economiste				59 060,00		DAL	74 000,00	4 000,00
Acousticien				-		META Acoustique	20 050,00	-
Geotechnique				-		GEOLIA	11 500,00	13 025,00
MOEx/OPC				323 000,00		EMPEERING	311 000,00	12 000,00
MOE Curage / Dépollution				38 500,00		Galéna Conseil	31 500,00	3 500,00
						LS CONSEILS - MOE	14 500,00	-
CTC				43 500,00		SOCOTEC	33 500,00	22 000,00
CSPS				17 000,00		LS CONSEILS - CSPS	7 200,00	-
AMO				218 100,00		ROM	215 000,00	54 500,00
AMO Environnemental				58 800,00		OASIIS	58 800,00	2 400,00
Etudes AMO Environnemental						OASIIS	25 000,00	
Assurances				129 964,57		non attribué	129 964,57	
Diagnostics								
Géomètre				70 000,00		GE3D Paris	6 920,00	16 813,00
Certifications						PRESTATERRE	4 830,00	
Divers				-		ENEZ SUN	18 960,00	
						ID Capture	4 600,00	-
						PIC 92	401,65	-

	CONCEPTION					EXECUTION		
	Programme	APS	APD	DCE Ind. 1		Entreprise	MARCHE	TS
						BC2E	900,00	-
						CERQUAL	8 109,00	-
						LS CONSEILS	7 740,00	
Total HT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 600 955,00**			**8 678 949,74**	**664 228,29**
								9 343 178,03

Bordereau de transmission

42RBOUL

Liste des factures - 10 avril 26

		Société	Date de validation	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
20/11/2021	20211102-000172	HAME	20/11/2021	1 630,00	1 956,00	0%	1%	68%
20/12/2021	20211220-000182	HAME	20/12/2021	6 520,00	7 172,00	0%	2%	68%
02/05/2022	20220502-000215	HAME	02/05/2022	5 000,00	6 000,00	0%	2%	68%
31/05/2022	F00222	ALTERNET	17/06/2022	0,00	0,00	0%	0%	0%
16/05/2022	074_LEF_H&A	LABFAB	17/06/2022	0,00	0,00	0%	0%	0%
09/06/2022	022 06 002	LS CONSEILS	17/06/2022	0,00	0,00	0%	0%	0%
25/05/2022	2022/068	ROM	17/06/2022	37 400,00	44 880,00	0%	14%	60%
25/03/2022	11113/11090	DAL	17/06/2022	8 300,00	9 960,00	0%	11%	100%
20/06/2022	20220620-000225	HAME	22/06/2022	5 000,00	6 000,00	0%	2%	68%
30/05/2022	20220530-000221	HAME	22/06/2022	1 850,00	2 220,00	0%	1%	68%
15/06/2022	22-07/027	DEAR CONCEPT	11/07/2022	0,00	0,00	0%	0%	0%
31/07/2022	F22072009	ALTERNET	30/08/2022	0,00	0,00	0%	0%	0%
15/02/2022	22-03/010	DEAR CONCEPT	31/08/2022	0,00	0,00	0%	0%	0%
15/09/2022	144_LEF_H&A_2	LABFAB	16/09/2022	0,00	0,00	0%	0%	0%
07/09/2022	FVQMC2206277	CERQUAL	21/09/2022	1 614,75	1 937,70	0%	20%	20%
31/08/2022	F22082160	ALTERNET	26/09/2022	0,00	0,00	0%	0%	0%
23/06/2022	NC	LS CONSEILS	29/09/2022	0,00	0,00	0%	0%	0%
23/06/2022	F 022 06 023	LS CONSEILS	29/09/2022	0,00	0,00	0%	0%	0%
23/06/2022	F 022 06 023	LS CONSEILS	29/09/2022	0,00	0,00	0%	0%	0%
23/06/2022	F 022 06 023	LS CONSEILS	29/09/2022	0,00	0,00	0%	0%	0%
30/09/2022	30922	Monteiro & Co	30/09/2022	0,00	0,00	0%	0%	0%
30/09/2022	164_LEF_H&A_3	LABFAB	30/09/2022	0,00	0,00	0%	0%	0%
27/09/2022	MH 221118	GEOLIA	06/10/2022	11 500,00	13 800,00	0%	47%	65%
25/10/2022	NH / 2022 / 157	ROM	25/10/2022	9 250,00	11 100,00	0%	3%	60%
08/11/2022	11286-11090	DAL	10/11/2022	18 740,00	22 488,00	0%	24%	100%
09/11/2022	182_LEF_H&A_4	LAB Ingenierie	10/11/2022	0,00	0,00	0%	0%	0%
14/11/2022	022 11 0001	LS CONSEILS	18/11/2022	0,00	0,00	0%	0%	0%
22/11/2022	022 11 002	LS CONSEILS	25/11/2022	0,00	0,00	0%	0%	0%
01/10/2022	242	HAME	30/11/2022	25 000,00	30 000,00	0%	10%	68%
08/12/2022	F 22 122 491	ALTERNET	16/12/2022	0,00	0,00	0%	0%	0%
16/12/2022	__	PIC 92	16/12/2022	192,79	231,35	0%	48%	48%
08/12/2022	F 22 122 491	ALTERNET	16/12/2022	0,00	0,00	0%	0%	0%

42RBOUL

Liste des factures - 10 avril 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
08/12/2022	F 2022 - 633	META Acoustique	09/01/2023	3 770,00	4 524,00	0%	19%	41%
22/11/2021	2021386	PRESSBURGER	11/01/2023	0,00	0,00	0%	0%	0%
31/01/2023	Pm2301009	TTGE	15/02/2023	0,00	0,00	0%	0%	0%
17/05/2023	Facture N° 301	HAME	09/07/2024	12 500,00	15 000,00	0%	5%	68%
27/06/2024	11923/11090	DAL	09/07/2024	10 400,00	12 480,00	0%	13%	100%
14/06/2024	Facture N° 395	HAME	09/07/2024	12 500,00	15 000,00	0%	5%	68%
25/07/2024	NH / 2024 / 098	ROM	02/08/2024	9 250,00	11 100,00	0%	3%	60%
28/06/2024	Situation N°1	PAX	11/10/2024	27 200,00	32 640,00	0%	14%	73%
26/09/2024	Situation N°2	PAX	11/10/2024	27 200,00	32 640,00	0%	14%	73%
26/09/2024	BG2409000627	Galéna Conseil	11/10/2024	4 000,00	4 800,00	0%	11%	100%
03/09/2024	FA2409-0308	PRIMUS DIAG	18/11/2024	14 750,00	17 700,00	0%	100%	100%
17/10/2024	BG2410000666	Galéna Conseil	18/11/2024	7 500,00	9 000,00	0%	21%	100%
11/10/2024	FA24 1011	OASIIS	18/11/2024	5 600,00	6 720,00	0%	9%	59%
08/11/2024	FA24 1128	OASIIS	18/11/2024	8 200,00	9 840,00	0%	13%	59%
28/11/2024	Situation N°3	PAX	12/12/2024	23 800,00	28 560,00	0%	13%	73%
27/11/2024	FA24 1207	OASIIS	12/12/2024	5 600,00	6 720,00	0%	9%	59%
28/11/2024	180	SOCOTEC	12/12/2024	2 800,00	3 360,00	0%	5%	44%
22/11/2024	BG2411000757	Galéna Conseil	12/12/2024	1 750,00	2 100,00	0%	5%	100%
29/11/2024	203	SOCOTEC	12/12/2024	4 200,00	5 040,00	0%	8%	44%
11/12/2024	FA24 1275	OASIIS	12/12/2024	1 680,29	2 016,35	0%	7%	20%
24/12/2024	F 2024 - 905	META Acoustique	15/01/2025	4 480,00	5 376,00	0%	22%	41%
18/12/2024	FA24 1303	OASIIS	15/01/2025	5 000,00	6 000,00	0%	8%	59%
25/12/2024	NH / 2024 / 186	ROM	15/01/2025	18 700,00	22 440,00	0%	7%	60%
12/12/2024	BG2412000806	Galéna Conseil	15/01/2025	1 750,00	2 100,00	0%	5%	100%
08/01/2025	FA25 0015	OASIIS	15/01/2025	6 400,00	7 680,00	0%	10%	59%
31/12/2024	12113/11090	DAL	15/01/2025	15 560,00	18 672,00	0%	20%	100%
20/11/2024	429	HAME	07/02/2025	40 000,00	48 000,00	0%	16%	68%
22/01/2025	Situation N°1	LOT 00 - 4D DEMOLITION	07/02/2025	21 817,30	26 180,76	0%	2%	94%
24/01/2025	BG2501000039	Galéna Conseil	07/02/2025	3 150,00	3 780,00	0%	9%	100%
25/01/2025	NH / 2025 / 002	ROM	07/02/2025	16 000,00	19 200,00	0%	6%	60%
24/01/2025	Situation N°4	PAX	11/03/2025	32 060,00	38 472,00	0%	17%	73%
14/01/2025	55907	EXIM	11/03/2025	2 880,00	3 456,00	0%	84%	100%

42RBOUL

Liste des factures - 10 avril 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D[illegible]ement total du contrat
30/01/2025	2540	EMPEERING	11/03/2025	6 000,00	7 200,00	0%	2%	33%
19/02/2025	BG2502000099	Galéna Conseil	11/03/2025	3 150,00	3 780,00	0%	9%	100%
24/02/2025	Situation N°2	LOT 00 - 4D DEMOLITION	11/03/2025	181 633,30	217 959,96	0%	18%	94%
11/02/2025	56375	EXIM	10/04/2025	540,00	648,00	0%	16%	100%
28/03/2025	Situation N°3	LOT 00 - 4D DEMOLITION	10/04/2025	134 206,30	161 047,56	0%	14%	94%
08/04/2025	479	HAME	10/04/2025	10 000,00	12 000,00	0%	4%	68%
20/03/2025	BG2503000164	Galéna Conseil	10/04/2025	3 150,00	3 780,00	0%	9%	100%
30/01/2025	Facture N°20250081	ENEZ SUN	10/04/2025	5 973,00	7 167,60	0%	32%	32%
28/02/2025	2604	EMPEERING	10/04/2025	6 000,00	7 200,00	0%	2%	33%
17/04/2025	751101209	BC2E	07/05/2025	600,00	720,00	0%	67%	67%
17/04/2025	BG2504000253	Galéna Conseil	07/05/2025	3 150,00	3 780,00	0%	9%	100%
31/03/2025	2660	EMPEERING	07/05/2025	6 000,00	7 200,00	0%	2%	33%
14/04/2025	FA25 0378	OASIIS	07/05/2025	3 200,00	3 840,00	0%	5%	59%
25/04/2025	NH / 2025 / 041	ROM	07/05/2025	16 000,00	19 200,00	0%	6%	60%
30/04/2025	Situation N°4	LOT 00 - 4D DEMOLITION	07/05/2025	151 159,00	181 390,80	0%	15%	94%
30/04/2025	12225/11090	DAL	07/05/2025	4 000,00	4 800,00	0%	5%	100%
23/05/2025	Situation N°5	LOT 00 - 4D DEMOLITION	13/06/2025	89 620,00	107 544,00	0%	9%	94%
30/05/2025	FA25 0594	OASIIS	13/06/2025	3 246,25	3 895,50	0%	13%	20%
30/05/2025	Situation N°5	PAX	13/06/2025	11 900,00	14 280,00	0%	6%	73%
28/05/2025	BG2505000358	Galéna Conseil	13/06/2025	3 500,00	4 200,00	0%	10%	100%
30/04/2025	2711	EMPEERING	13/06/2025	6 000,00	7 200,00	0%	2%	33%
04/07/2025	11	SOCOTEC	11/07/2025	1 212,11	1 454,53	0%	2%	44%
04/07/2025	66	SOCOTEC	11/07/2025	669,07	802,88	0%	1%	44%
26/06/2025	506	SOCOTEC	11/07/2025	1 720,47	2 064,56	0%	3%	44%
25/06/2025	478	SOCOTEC	11/07/2025	5 256,98	6 308,38	0%	9%	44%
24/06/2025	142	SOCOTEC	11/07/2025	1 465,81	1 758,97	0%	3%	44%
09/07/2025	Situation N°6	LOT 00 - 4D DEMOLITION	11/07/2025	146 117,27	175 340,72	0%	15%	94%
09/04/2025	480	HAME	11/07/2025	50 000,00	60 000,00	0%	20%	68%
26/05/2025	497	HAME	11/07/2025	3 000,00	3 600,00	0%	1%	68%
08/07/2025	070725-4452	STRUCTURA - LAB	11/07/2025	2 200,00	2 640,00	0%	3%	10%
15/04/2025	MH 250414	GEOLIA	11/07/2025	4 350,00	5 220,00	0%	18%	65%
31/05/2025	2748	EMPEERING	11/07/2025	6 000,00	7 200,00	0%	2%	33%

42RBOUL

Liste des factures - 10 avril 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
30/06/2025	2824	EMPEERING	11/07/2025	6 000,00	7 200,00	0%	2%	33%
24/07/2025	Situation N°7	LOT 00 - 4D DEMOLITION	30/07/2025	138 187,50	165 825,00	0%	14%	94%
30/06/2025	Situation N°6	PAX	30/07/2025	6 800,00	8 160,00	0%	4%	73%
30/06/2025	BG2506000401	Galéna Conseil	10/09/2025	1 050,00	1 260,00	0%	3%	100%
08/07/2025	BG2507000491	Galéna Conseil	10/09/2025	2 500,00	3 000,00	0%	7%	100%
19/05/2025	BG2508000532	Galéna Conseil	10/09/2025	350,00	420,00	0%	1%	100%
04/09/2025	102	SOCOTEC	10/09/2025	669,59	803,51	0%	1%	44%
01/08/2025	NH-2025-0839	ROM	10/09/2025	18 000,00	21 600,00	0%	7%	60%
01/09/2025	Situation N°8	LOT 00 - 4D DEMOLITION	14/10/2025	62 082,57	74 499,08	0%	6%	94%
01/09/2025	Situation N°0-F	LOT 15 - FERN ENERGIES	14/10/2025	66 300,00	79 560,00	Caution	10%	11%
01/09/2025	Situation N°0-G	LOT 01/02A/02B/03/04 - GAGNERAUD	14/10/2025	464 785,19	557 742,23	Caution	14%	18%
07/10/2025	109	SOCOTEC	14/10/2025	672,05	806,46	0%	1%	44%
14/08/2025	106	SOCOTEC	22/10/2025	2 513,10	3 015,72	0%	5%	44%
26/06/2025	131	SOCOTEC	23/10/2025	2 516,85	3 020,22	0%	5%	44%
19/09/2025	61	SOCOTEC	24/10/2025	667,08	800,50	0%	1%	44%
01/10/2025	Situation N°1-G	LOT 01/02A/02B/03/04 - GAGNERAUD	10/11/2025	39 853,98	47 824,78	Caution	1%	18%
15/10/2025	NH-2025-1078	ROM	10/11/2025	18 000,00	21 600,00	0%	7%	60%
06/11/2025	12382/11090	DAL	10/11/2025	12 600,00	15 120,00	0%	16%	100%
31/10/2025	3053	EMPEERING	12/12/2025	14 000,00	16 800,00	0%	4%	33%
25/11/2025	FA25 1280	OASIIS	12/12/2025	2 400,00	2 880,00	0%	4%	59%
13/11/2025	4452-1-OUV	STRUCTURA - LAB	12/12/2025	4 125,00	4 950,00	0%	6%	10%
23/12/2025	025-012-024	LS CONSEILS - MOE	14/01/2026	5 075,00	6 090,00	0%	35%	100%
01/12/2025	Situation N°1-F	LOT 15 - FERN ENERGIES	14/01/2026	5 857,18	7 028,62	Caution	1%	11%
30/11/2025	3113	EMPEERING	14/01/2026	14 000,00	16 800,00	0%	4%	33%
28/01/2026	NH-2026-0111	ROM	13/02/2026	18 000,00	21 600,00	0%	7%	60%
30/01/2026	202601-012445	DAL	13/02/2026	8 400,00	10 080,00	0%	11%	100%
28/01/2026	Situation N°0-GR	LOT 16 - GREENWORKS	13/02/2026	54 262,26	65 114,71	0%	10%	10%
16/01/2026	026-001-002	LS CONSEILS	13/02/2026	500,00	600,00	0%	5%	84%
31/12/2025	3163	EMPEERING	13/02/2026	14 000,00	16 800,00	0%	4%	33%
01/02/2026	Situation N°2-G	LOT 01/02A/02B/03/04 - GAGNERAUD	20/02/2026	73 317,19	87 980,63	Caution	2%	18%
30/01/2026	3226	EMPEERING	16/03/2026	14 000,00	16 800,00	0%	4%	33%
23/02/2026	026-002-023	LS CONSEILS	16/03/2026	3 610,00	4 332,00	0%	39%	84%

42RBOUL

Liste des factures - 10 avril 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
24/02/2026	026-002-022	LS CONSEILS	16/03/2026	2 680,00	3 216,00	0%	29%	84%
23/02/2026	026-002-021	LS CONSEILS - CSPS	16/03/2026	2 700,00	3 240,00	0%	38%	69%
06/03/2026	026-003-003	LS CONSEILS	16/03/2026	950,00	1 140,00	0%	10%	84%
06/03/2026	11854	PRESTATERRE	16/03/2026	2 415,00	2 898,00	0%	50%	50%
27/02/2026	Situation N°7	PAX	16/03/2026	8 075,00	9 690,00	0%	4%	73%
06/03/2026	026-003-006	LS CONSEILS - MOE	16/03/2026	4 712,50	5 655,00	0%	33%	100%
19/02/2026	2602-890	SYMBIOSE	16/03/2026	1 290,00	1 548,00	0%	30%	30%
28/02/2026	3269	EMPEERING	10/04/2026	14 000,00	16 800,00	0%	4%	33%
20/03/2026	026-003-020	LS CONSEILS - MOE	10/04/2026	4 712,50	5 655,00	0%	33%	100%
20/03/2026	026-003-021	LS CONSEILS - CSPS	10/04/2026	2 250,00	2 700,00	0%	31%	69%
20/03/2026	IDC2600468	ID Capture	10/04/2026	450,00	540,00	0%	10%	10%
