LILIB

Tableau récapitulatif du projet - 10 avril 26

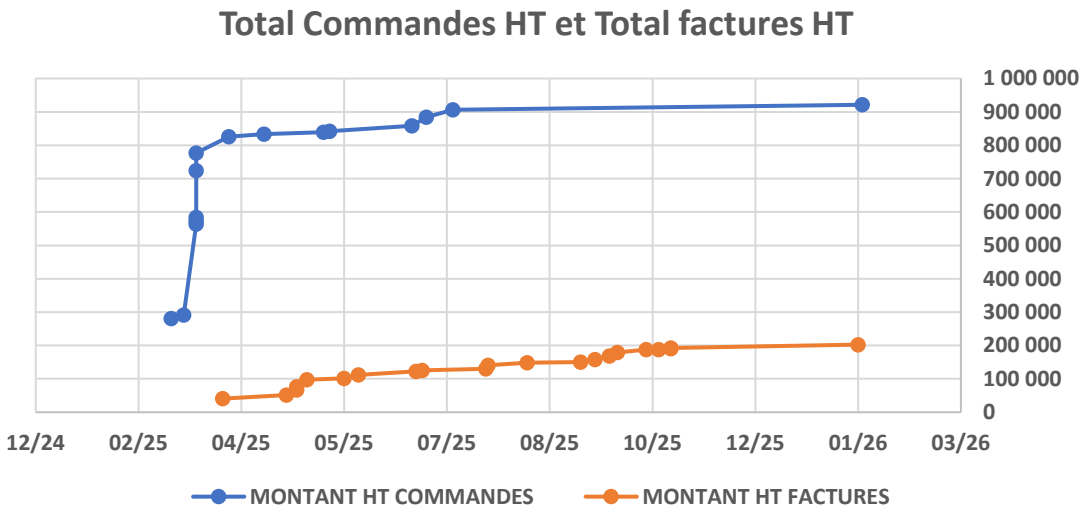



Récapitulatif des dépenses du projet	
Nombre total de commandes	**15**
Nombre total d'avenants	**2**
Nombre de commandes actives	**13**
Nombre total factures	**21**
Montant total commandes (HT)	**921 283,00**
Montant total factures (HT)	**202 618,90**
Total commandes honoraires (HT)	**888 033,00**
Total commandes travaux (HT)	**0,00**
Total commandes divers (HT)	**33 250,00**
Total TVA Commandes	**184 256,60**
Total TVA factures	**40 523,78**
Nombre de factures avec retenue	**0**
Montant total retenue de garantie (HT)	**0,00**
Montant total commandes (TTC)	**1 105 539,60**
Montant total factures (TTC)	**243 142,68**

Progression du paiement	
% D'avancement - 10 avril 26	**1%**
% D'avancement total	**22%**

Bordereau de transmission

LILIB

Tableau récapitulatif du projet - contacts - 10 avril 26

Société	Contacts 1	Contacts 2	Contacts 3
ROM	Bertrand Roux - rom-br@r-o-m.fr - +33624503631	Riccardo Azzi - rom-ra@r-o-m.fr - +33601487521	
GBL ARCHITECTES	Rose Lepage - rlepage@gbl-architectes.com - +33320725424	Guillaume Hiriart - ghiriart@gbl-architectes.com - +33320725424	Julien Hincelin - jhincelin@gbl-architectes.com - +33658165711
DBS	Bertrand Schuppe - b.schuppe@dbs-acoustique.fr - +33686813681		
ALPES CONTRÔLES	Laetitia Chagnaud (CSPS) - lchagnaud@alpes-controles.fr - +33647020075	Jean-Philippe Mayeux (CTC) - jmayeux@alpes-controles.fr - +33788331744	
NORTEC	Cyril Demerssemand - nsaidoune@nortecbet.com - +33643254054	Newfel Saidoune	
LTA	Mathieu Debosschere - debosschere@ltaeco.com - +33664463235	Iannis Layaud - layaud@ltaeco.com - +33144548484	
KEDROUS	Gary Kechichian - gary.kechichian@kedrous.com - +33666236711	Claire Coiffe - claire.coiffe@kedrous.com - +33664806601	
METIGA	Hortense Fievet - hortense.fievet@metiga.fr	Angélique Perraut - angelique.perraut@metiga.fr	
MANTENNA	Gabrielle Piat - g.piat@mantenna.fr - +33675674119	Emmanuel Grandpierre - e.grandpierre@mantenna.fr	
ERBOS			
CIMEO	Jeremy Bloquet - jeremy.bloquet@cimeo-structures.fr - +33643425793		
GEXPERTISE	Louis Adriansen - l.adriansen@gexpertise.fr - +33366726128		

LILIB

Tableau récapitulatif des commandes (LOTs) - 10 avril 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	**Montant HT**	**LOT**	**Société**	**Montant HT**	**LOT**	**Société**	**Montant HT**	**LOT**
ROM	295 250,00	AMO				CIMEO	7 500,00	Sondages
GBL ARCHITECTES	272 295,30	ARCHITECTE				GEXPERTISE	25 750,00	Géomètre
DBS	11 000,00	BET Acoustique						
ALPES CONTRÔLES	8 180,00	CSPS						
ALPES CONTRÔLES	11 800,00	Bureau de Contrôle						
NORTEC	139 700,05	BET						
LTA	53 404,65	Economiste						
KEDROUS	64 200,00	AMO Environnemental						
METIGA	3 650,00	Ecologue						
MANTENNA	5 553,00	BET ondes Electromagnétiques						
ERBOS	23 000,00	Commissioning HQE						

Bordereau de transmission

LILIB

Tableau récapitulatif des commandes (valeur HT restante) - 10 avril 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	**Montant HT**	**Valeur HT restante**	**Société**	**Montant HT**	**Valeur HT restante**	**Société**	**Montant HT**	**Valeur HT restante**
ROM	295 250,00	181 423,10				CIMEO	7 500,00	0,00
GBL ARCHITECTES	272 295,30	250 761,24				GEXPERTISE	25 750,00	9 698,00
DBS	11 000,00	11 000,00						
ALPES CONTRÔLES	8 180,00	8 180,00						
ALPES CONTRÔLES	11 800,00	11 800,00						
NORTEC	139 700,05	123 699,60						
LTA	53 404,65	44 399,16						
KEDROUS	64 200,00	45 500,00						
METIGA	3 650,00	3 650,00						
MANTENNA	5 553,00	5 553,00						
ERBOS	23 000,00	23 000,00						

LILIB

Tableau récapitulatif des commandes (% d'avancement) - 10 avril 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	Montant HT	% D'avancement	Société	Montant HT	% D'avancement	Société	Montant HT	% D'avancement
ROM	295 250,00	39%				CIMEO	7 500,00	100%
GBL ARCHITECTES	272 295,30	8%				GEXPERTISE	25 750,00	62%
DBS	11 000,00	0%						
ALPES CONTRÔLES	8 180,00	0%						
ALPES CONTRÔLES	11 800,00	0%						
NORTEC	139 700,05	11%						
LTA	53 404,65	17%						
KEDROUS	64 200,00	29%						
METIGA	3 650,00	0%						
MANTENNA	5 553,00	0%						
ERBOS	23 000,00	0%						

LILIB

Budget - 10 avril 26

Estimation		APS			Engagements 16 mars 26	Disponibles 16 mars 26
Intitulés		**Gombert**	**Liberté**	**Total HT**		
Installation de chantier		80 000,00	280 000,00	360 000,00		360 000,00
Prorata		21 000,00	73 000,00	94 000,00		94 000,00
Curage		150 000,00	330 000,00	480 000,00		480 000,00
Structure		647 000,00	1 321 000,00	1 968 000,00		1 968 000,00
CET		199 000,00	1 044 000,00	1 243 000,00		1 243 000,00
CEA		70 500,00	973 000,00	1 043 500,00		1 043 500,00
Aménagements extérieurs		0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00
Sous-total travaux 1				5 268 500,00		
Imprévus		7,00%		368 795,00	23 000,00	345 795,00
Sous-total travaux 2				5 637 295,00		
Architecte	GBL	1,00	272 295,30	272 295,30	272 295,30	0,00
BET	NORTEC	1,00	139 700,05	139 700,05	139 700,05	0,00
MOEx / OPC / Synthèse	Budget	18,00	15 000,00	270 000,00		270 000,00
Economiste	LTA	1,00	53 404,65	53 404,65	53 404,65	0,00
Acousticien	DBS	1,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
CTC	ALPE CONTRÔLE	1,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00
CSPS	ALPE CONTRÔLE	1,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00
AMO	ROM	1,00	280 750,00	280 750,00	295 250,00	-14 500,00
AMO Environnemental	KEDROUS	1,00	48 600,00	48 600,00	64 200,00	-15 600,00
Assurances	-	0,02	6 733 025,00	121 194,45		121 194,45
Diagnostics	CIMEO	1,00	7 000,00	7 000,00	7 500,00	-500,00
Etudes environnementales	Divers	1,00	50 003,00	50 003,00	9 203,00	40 800,00
Géomètre	Budget	1,00	30 000,00	30 000,00	25 750,00	4 250,00
Total HT				**6 941 222,45**	**921 283,00**	**6 019 939,45**

Bordereau de transmission

LILIB

Liste des factures - 10 avril 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
25/03/2025	NH / 2025 / 036	ROM	25/03/2025	40 798,07	48 957,68	0%	14%	39%
25/04/2025	NH / 2025 / 044	ROM	07/05/2025	10 432,69	12 519,23	0%	4%	39%
30/04/2025	NH 1	NORTEC	07/05/2025	16 000,45	19 200,54	0%	11%	11%
05/05/2025	NH 1	GBL ARCHITECTES	07/05/2025	21 534,06	25 840,87	0%	8%	8%
30/04/2025	NH 1	LTA	07/05/2025	9 005,49	10 806,59	0%	17%	17%
30/05/2025	NH-2025-052	ROM	12/06/2025	10 432,69	12 519,23	0%	4%	39%
23/05/2025	Kedrous 0009	KEDROUS	12/06/2025	3 700,00	4 440,00	0%	6%	29%
30/06/2025	Kedrous 0018	KEDROUS	10/07/2025	2 800,00	3 360,00	0%	4%	29%
27/06/2025	NH-2025-0634	ROM	10/07/2025	10 432,69	12 519,23	0%	4%	39%
31/07/2025	Kedrous 0026	KEDROUS	10/09/2025	5 400,00	6 480,00	0%	8%	29%
20/08/2025	2025/00115	CIMEO	10/09/2025	7 500,00	9 000,00	0%	100%	100%
01/08/2025	NH-2025-0841	ROM	10/09/2025	10 432,69	12 519,23	0%	4%	39%
29/09/2025	NH-2025-0966	ROM	09/10/2025	10 432,69	12 519,23	0%	4%	39%
22/09/2025	25/003243	GEXPERTISE	09/10/2025	7 722,00	9 266,40	0%	30%	62%
15/09/2025	Kedrous 0029	KEDROUS	09/10/2025	2 000,00	2 400,00	0%	3%	29%
29/10/2025	Kedrous 0036	KEDROUS	10/11/2025	2 400,00	2 880,00	0%	4%	29%
29/10/2025	Kedrous 0037	KEDROUS	10/11/2025	1 600,00	1 920,00	0%	2%	29%
23/10/2025	Kedrous 0033	KEDROUS	10/11/2025	800,00	960,00	0%	1%	29%
17/10/2025	25/003593	GEXPERTISE	10/11/2025	8 330,00	9 996,00	0%	32%	62%
03/10/2025	NH-2025-1292	ROM	12/12/2025	10 432,69	12 519,23	0%	4%	39%
28/01/2026	NH-2026-0113	ROM	16/02/2026	10 432,69	12 519,23	0%	4%	39%
