11 HAVRE

Bordereau de paiement - 10 avril 26

Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT	TVA	Montant TTC	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
F260226101CK	ARCOS	10/04/2026	12 000,00	2 400,00	14 400,00	5%	7%
F260326103CK	ARCOS	10/04/2026	6 000,00	1 200,00	7 200,00	2%	7%
NH-2026-0333	ROM	10/04/2026	12 000,00	2 400,00	14 400,00	7%	79%
2026-0267	VISORI	10/04/2026	799,00	159,80	958,80	10%	20%

36 958,80

Bon à payer

ROM
ROUX ŒUVRE MAITRISE
110 Boulevard Jean Jaurès
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
SAS au capital de 15.000€
RCS Nanterre B 408 566 701
APE 7112B – SIRET 408 566 701 000 53

11 HAVRE

Tableau récapitulatif du projet - 10 avril 26

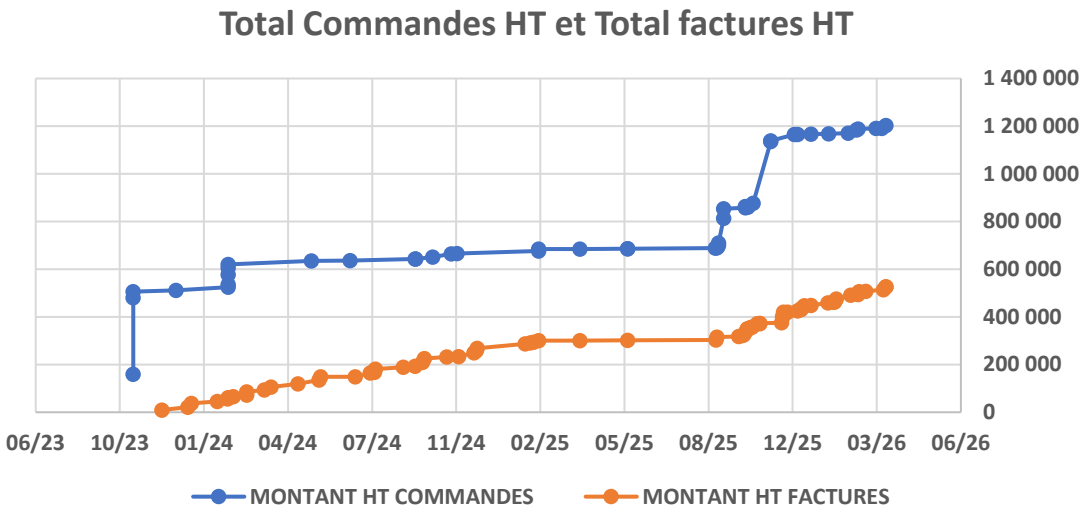

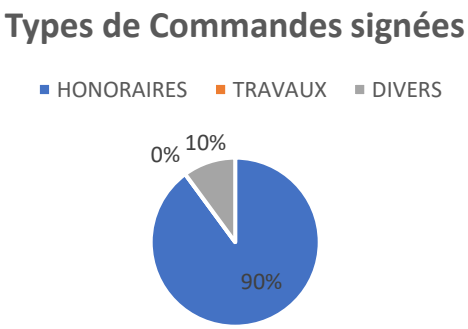

Récapitulatif des dépenses du projet	
Nombre total de commandes	**45**
Nombre total d'avenants	**12**
Nombre de commandes actives	**33**
Nombre total factures	**67**
Montant total commandes (HT)	**1 202 352,80**
Montant total factures (HT)	**526 429,18**
Total commandes honoraires (HT)	**1 081 112,00**
Total commandes travaux (HT)	**0,00**
Total commandes divers (HT)	**121 240,80**
Total TVA Commandes	**240 470,56**
Total TVA factures	**105 285,84**
Nombre de factures avec retenue	**0**
Montant total retenue de garantie (HT)	**0,00**
Montant total commandes (TTC)	**1 442 823,36**
Montant total factures (TTC)	**631 715,02**

Progression du paiement	
% D'avancement - 10 avril 26	**3%**
% D'avancement total	**44%**

Bordereau de transmission

11 HAVRE

Tableau récapitulatif des commandes (LOTs) - 10 avril 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	**Montant HT**	**LOT**	**Société**	**Montant HT**	**LOT**	**Société**	**Montant HT**	**LOT**
ROM	172 000,00	AMO				LANQUETIN	5 100,00	Géomètre
MARTIN HERBET	350 000,00	ARCHITECTE				BTP	15 215,00	Diagnostic amiante et plomb
VISORI	13 950,00	Bureau de Contrôle				LANQUETIN	800,00	Géomètre
SOL CONSEIL	26 900,00	BE Géotechnique				BOTTE SONDAGES	20 480,00	Sondages Structure
OPTIMUM	40 600,00	BE Structure				GRAPHIC PROCEDE	205,00	Panneau de Chantier
ITMR	29 000,00	BE Fluides				AJM	3 100,00	Maintenance
BATISS	15 000,00	BE Incendie				BALAS	450,00	Maintenance
GENERAL ACOUSTICS	7 705,00	BE Acoustique				OASIIS	40 000,00	Frais certification
SINTEO	8 000,00	AMO DD				ESI	5 126,67	Diagnostic amiante et plomb
DAL	2 500,00	Économiste				GALENA	2 200,00	Lingettes plomb
OASIIS	103 200,00	AMO DD 2				BOTTE SONDAGES	10 942,00	Sondages Fondations
VISORI	7 990,00	CSPS				M&M	3 265,00	Nettoyage
LS CONSEILS	3 995,00	PEMD				ORANGE	495,00	Concessionaire - O
OASIIS	4 000,00	Ecologue				ENEDIS	14 022,13	Concessionaire - E
DEKRA	2 362,00	Bilan Patrimoine						
ARCOS	259 900,00	MOEx et OPC						
AIDF	2 600,00	Demande Voirie						
GALENA	26 000,00	MOE Dépollution						
GAYET	5 250,00	Coordinateur SSI						

11 HAVRE

Tableau récapitulatif des commandes (valeur HT restante) - 10 avril 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	Montant HT	Valeur HT restante	Société	Montant HT	Valeur HT restante	Société	Montant HT	Valeur HT restante
ROM	172 000,00	36 000,00				LANQUETIN	5 100,00	0,00
MARTIN HERBET	350 000,00	168 000,00				BTP	15 215,00	0,00
VISORI	13 950,00	12 555,00				LANQUETIN	800,00	0,00
SOL CONSEIL	26 900,00	19 390,00				BOTTE SONDAGES	20 480,00	0,00
OPTIMUM	40 600,00	10 620,00				GRAPHIC PROCEDE	205,00	0,00
ITMR	29 000,00	22 500,00				AJM	3 100,00	0,00
BATISS	15 000,00	4 800,00				BALAS	450,00	0,00
GENERAL ACOUSTICS	7 705,00	0,00				OASIIS	40 000,00	40 000,00
SINTEO	8 000,00	0,00				ESI	5 126,67	1 812,49
DAL	2 500,00	0,00				GALENA	2 200,00	2 200,00
OASIIS	103 200,00	57 180,00				BOTTE SONDAGES	10 942,00	10 942,00
VISORI	7 990,00	6 392,00				M&M	3 265,00	3 265,00
LS CONSEILS	3 995,00	0,00				ORANGE	495,00	495,00
OASIIS	4 000,00	0,00				ENEDIS	14 022,13	14 022,13
DEKRA	2 362,00	0,00						
ARCOS	259 900,00	241 900,00						
AIDF	2 600,00	2 600,00						
GALENA	26 000,00	16 000,00						
GAYET	5 250,00	5 250,00						

11 HAVRE

Tableau récapitulatif des commandes (% d'avancement) - 10 avril 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	Montant HT	% D'avancement	Société	Montant HT	% D'avancement	Société	Montant HT	% D'avancement
ROM	172 000,00	79%				LANQUETIN	5 100,00	100%
MARTIN HERBET	350 000,00	52%				BTP	15 215,00	100%
VISORI	13 950,00	10%				LANQUETIN	800,00	100%
SOL CONSEIL	26 900,00	28%				BOTTE SONDAGES	20 480,00	100%
OPTIMUM	40 600,00	74%				GRAPHIC PROCEDE	205,00	100%
ITMR	29 000,00	22%				AJM	3 100,00	100%
BATISS	15 000,00	68%				BALAS	450,00	100%
GENERAL ACOUSTICS	7 705,00	100%				OASIIS	40 000,00	0%
SINTEO	8 000,00	100%				ESI	5 126,67	65%
DAL	2 500,00	100%				GALENA	2 200,00	0%
OASIIS	103 200,00	45%				BOTTE SONDAGES	10 942,00	0%
VISORI	7 990,00	20%				M&M	3 265,00	0%
LS CONSEILS	3 995,00	100%				ORANGE	495,00	0%
OASIIS	4 000,00	100%				ENEDIS	14 022,13 €	0%
DEKRA	2 362,00	100%						
ARCOS	259 900,00	7%						
AIDF	2 600,00	0%						
GALENA	26 000,00	38%						
GAYET	5 250,00	0%						

Bordereau de transmission

11 HAVRE

Liste des factures - 10 avril 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
25/12/2023	2023/168	ROM	25/12/2023	16 000,00	19 200,00	0%	9%	79%
06/02/2024	02.24A	MARTIN HERBET	06/02/2024	11 200,00	13 440,00	0%	3%	52%
07/02/2024	F240219377	LANQUETIN	15/02/2024	5 100,00	6 120,00	0%	100%	100%
20/11/2023	12.23B	MARTIN HERBET	15/02/2024	9 600,00	11 520,00	0%	3%	52%
25/01/2024	2024/013	ROM	15/02/2024	8 000,00	9 600,00	0%	5%	79%
13/02/2024	5635	OPTIMUM	15/02/2024	4 060,00	4 872,00	0%	10%	74%
21/12/2023	12.23A	MARTIN HERBET	15/02/2024	11 200,00	13 440,00	0%	3%	52%
29/02/2024	02.24E	MARTIN HERBET	29/02/2024	13 200,00	15 840,00	0%	4%	52%
29/03/2024	03.24C	MARTIN HERBET	29/03/2024	13 200,00	15 840,00	0%	4%	52%
21/03/2024	126225 SC MAS	SOL CONSEIL	08/04/2024	7 510,00	9 012,00	0%	28%	28%
30/04/2024	04.24F	MARTIN HERBET	30/04/2024	13 000,00	15 600,00	0%	4%	52%
29/02/2024	F-DIA92X-30-24-00890	BTP	02/05/2024	7 290,00	8 748,00	0%	48%	100%
27/05/2024	05.24A	MARTIN HERBET	27/05/2024	13 000,00	15 600,00	0%	4%	52%
25/05/2024	NH / 2024 / 054	ROM	06/06/2024	16 000,00	19 200,00	0%	9%	79%
07/07/2024	FT24070050	LANQUETIN	02/08/2024	800,00	960,00	0%	100%	100%
31/07/2024	07.24D	MARTIN HERBET	02/08/2024	13 600,00	16 320,00	0%	4%	52%
30/07/2024	FA 00631	ITMR	02/08/2024	2 500,00	3 000,00	0%	9%	22%
25/07/2024	NH / 2024 / 101	ROM	02/08/2024	16 000,00	19 200,00	0%	9%	79%
02/09/2024	P224F00352	BATISS	12/09/2024	7 700,00	9 240,00	0%	51%	68%
27/09/2024	09.24E	MARTIN HERBET	10/10/2024	16 000,00	19 200,00	0%	5%	52%
25/09/2024	NH / 2024 / 125	ROM	10/10/2024	16 000,00	19 200,00	0%	9%	79%
16/09/2024	8339	GENERAL ACOUSTICS	18/11/2024	4 020,00	4 824,00	0%	52%	100%
07/11/2024	30-24-05499	BTP	18/11/2024	765,00	918,00	0%	5%	100%
24/10/2024	30-24-05148	BTP	18/11/2024	7 160,00	8 592,00	0%	47%	100%
25/11/2024	NH / 2024 / 159	ROM	12/12/2024	16 000,00	19 200,00	0%	9%	79%
29/11/2024	2024 069 2	BOTTE SONDAGES	09/01/2025	10 805,00	12 966,00	0%	53%	100%
28/11/2024	24020	SINTEO	10/02/2025	8 000,00	9 600,00	0%	100%	100%
25/01/2025	NH / 2025 / 005	ROM	10/02/2025	20 000,00	24 000,00	0%	12%	79%
04/02/2025	P225F00064	BATISS	10/02/2025	2 500,00	3 000,00	0%	17%	68%
10/02/2025	02.25A	MARTIN HERBET	10/02/2025	7 000,00	8 400,00	0%	2%	52%
31/01/2025	8454	GENERAL ACOUSTICS	11/03/2025	3 685,00	4 422,00	0%	48%	100%
31/03/2025	FA00020937	GRAPHIC PROCEDE	31/03/2025	205,00	246,00	0%	100%	100%

11 HAVRE

Liste des factures - 10 avril 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
27/05/2025	2025/05/20-0053	AJM	16/06/2025	900,00	1 080,00	0%	29%	100%
09/09/2025	0077-2025	AJM	09/10/2025	1 200,00	1 440,00	0%	39%	100%
12/10/2025	22866	ESI	23/10/2025	3 154,18	3 785,02	0%	62%	65%
16/10/2025	2510012	BOTTE SONDAGES	23/10/2025	7 680,00	9 216,00	0%	38%	100%
16/10/2025	2510013	BOTTE SONDAGES	23/10/2025	1 995,00	2 394,00	0%	10%	100%
10/10/2025	FA00752	ITMR	23/10/2025	4 000,00	4 800,00	0%	14%	22%
15/10/2025	NH-2025-1075	ROM	23/10/2025	16 000,00	19 200,00	0%	9%	79%
06/10/2025	12350/11340	DAL	23/10/2025	2 500,00	3 000,00	0%	100%	100%
20/10/2025	FA25 1135	OASIIS	23/10/2025	5 600,00	6 720,00	0%	5%	45%
31/10/2025	2025-0816	VISORI	10/11/2025	799,00	958,80	0%	10%	20%
10/09/2025	09.25B	MARTIN HERBET	10/11/2025	12 000,00	14 400,00	0%	3%	52%
28/10/2025	6800	OPTIMUM	10/11/2025	14 760,00	17 712,00	0%	36%	74%
28/11/2025	FA25 1363	OASIIS	12/12/2025	4 000,00	4 800,00	0%	100%	100%
28/11/2025	FA25 1365	OASIIS	12/12/2025	15 280,00	18 336,00	0%	15%	45%
03/12/2025	F012521865	BALAS	12/12/2025	450,00	540,00	0%	100%	100%
31/10/2025	2025-0829	VISORI	12/12/2025	1 395,00	1 674,00	0%	10%	10%
27/11/2025	11.25B	MARTIN HERBET	12/12/2025	25 000,00	30 000,00	0%	7%	52%
31/12/2025	102/2025	AJM	14/01/2026	1 000,00	1 200,00	0%	32%	100%
19/12/2025	BG2512000909	GALENA	14/01/2026	6 500,00	7 800,00	0%	25%	38%
23/12/2025	12.25B	MARTIN HERBET	14/01/2026	12 000,00	14 400,00	0%	3%	52%
19/12/2025	025-012-017	LS CONSEILS	14/01/2026	3 995,00	4 794,00	0%	100%	100%
22/10/2025	22867	ESI	14/01/2026	160,00	192,00	0%	3%	65%
15/12/2025	FA25 1442	OASIIS	14/01/2026	4 500,00	5 400,00	0%	4%	45%
30/01/2026	01.26F	MARTIN HERBET	17/02/2026	12 000,00	14 400,00	0%	3%	52%
28/01/2026	FA26 0082	OASIIS	17/02/2026	2 000,00	2 400,00	0%	2%	45%
16/02/2026	FA26 0162	OASIIS	17/02/2026	16 400,00	19 680,00	0%	16%	45%
27/01/2026	BG2601000047	GALENA	17/02/2026	1 750,00	2 100,00	0%	7%	38%
20/01/2026	7001	OPTIMUM	17/02/2026	11 160,00	13 392,00	0%	27%	74%
26/11/2025	5443340A	DEKRA	17/02/2026	2 362,00	2 834,40	0%	100%	100%
25/02/2026	BG2602000144	GALENA	12/03/2026	1 750,00	2 100,00	0%	7%	38%
06/03/2026	FA26 0281	OASIIS	12/03/2026	2 240,00	2 688,00	0%	2%	45%
26/02/2026	F260226101CK	ARCOS	10/04/2026	12 000,00	14 400,00	0%		

11 HAVRE

Liste des factures - 10 avril 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
27/03/2026	F260326103CK	ARCOS	10/04/2026	6 000,00	7 200,00	0%	**2%**	**7%**
30/03/2026	NH-2026-0333	ROM	10/04/2026	12 000,00	14 400,00	0%	**7%**	**79%**
30/03/2026	2026-0267	VISORI	10/04/2026	799,00	958,80	0%	**10%**	**20%**
