PLAI

Tableau récapitulatif du projet - 10 avril 26

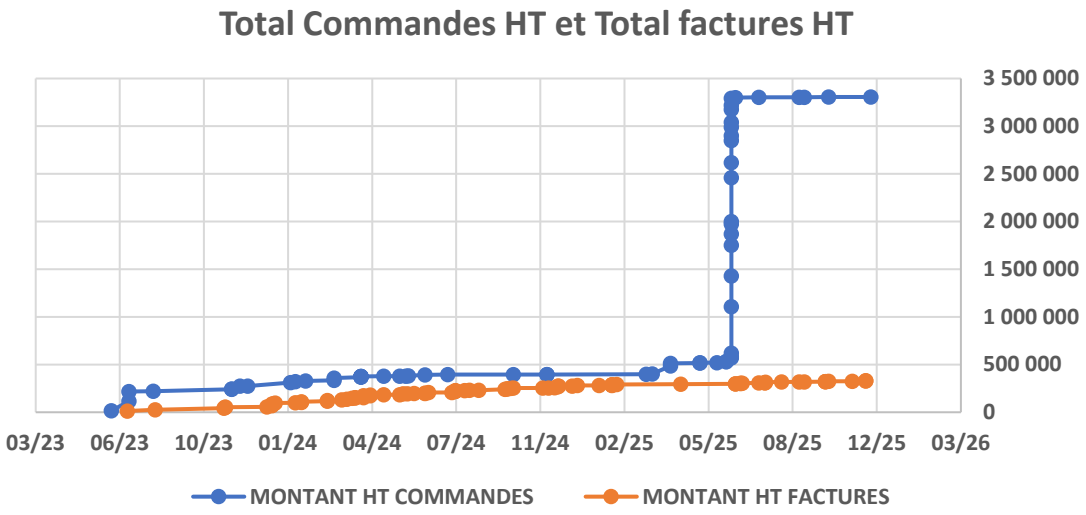

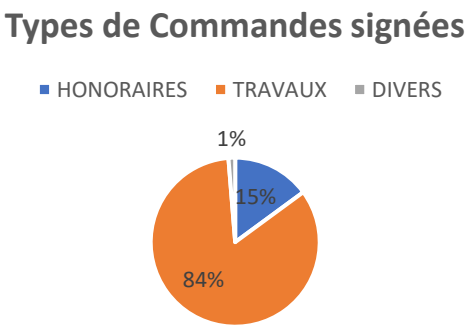

Récapitulatif des dépenses du projet	
Nombre total de commandes	**61**
Nombre total d'avenants	**26**
Nombre de commandes actives	**35**
Nombre total factures	**81**
Montant total commandes (HT)	**3 306 129,41**
Montant total factures (HT)	**331 197,94**
Total commandes honoraires (HT)	**493 350,00**
Total commandes travaux (HT)	**2 770 336,47**
Total commandes divers (HT)	**42 442,94**
Total TVA Commandes	**467 324,85**
Total TVA factures	**65 648,09**
Nombre de factures avec retenue	**0**
Montant total retenue de garantie (HT)	**0,00**
Montant total commandes (TTC)	**3 773 454,26**
Montant total factures (TTC)	**396 846,03**

Progression du paiement	
% D'avancement - 10 avril 26	**0%**
% D'avancement total	**10%**

Bordereau de transmission

PLAI

Tableau récapitulatif des commandes (LOTs) - 10 avril 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	**Montant HT**	**LOT**	**Société**	**Montant HT**	**LOT**	**Société**	**Montant HT**	**LOT**
SAOMA	152 500,00	ARCHITECTE	AJM	2 600,00	MACONNERIE 1	LEGRAND	18 850,00	Géomètre
ROM	100 000,00	AMO	PROBATI IDF	1 585,00	MACONNERIE 2	AMPB (BECHET)	7 080,00	Sondages
ITMR	44 250,00	BE Fluides	SASU HVENTIL	600,00	PLOMB.	LS CONSEILS	9 945,00	Diagnostic amiante et plomb
BUREAU VERITAS	3 110,00	Bureau de Contrôle	BALAS	475,00	PLOMBERIE - FUITE	ATB (BECHET)	480,00	PANNEAU CHANTIER
OPTIMUM	36 000,00	BE Structure	LOT 00-01-02-05-KAP	677 160,00	CHANT.CUR.DEMOL.FAC.	VENEZIA	624,74	Huissier
GAIDF	17 000,00	BE Géotechnique	LOT 02-05-KAP	352 912,02	DEMOL.FAC.	AJM	650,00	PANNEAU CHANTIER
LS CONSEILS	9 950,00	CSPS	LOT 03-04-06-07-08-SMART DESIGN	322 500,00	COUV.ETAC.MANU.SERR.	VENEZIA	628,20	Huissier
ARCOS	110 000,00	MOEx et OPC	LOT 04-06-07-08-SMART DESIGN	119 800,00	ETAC.MANU.SERR.	LEGRAND	3 000,00	Géomètre
GENERAL ACOUSTICS	7 740,00	BE acoustique	LOT 09-10-11-12-13-ISOSPACE	458 401,47	CLOIS.MAN.PARQ.REV.PEIN.	AJM	690,00	Maintenance
VISORI	12 800,00	Bureau de Contrôle 2	LOT 09-10-11-12-13-ISOSPACE	158 412,88	CLOIS.MAN.PARQ.REV.PEIN.	ORANGE	495,00	Concessionnaire
			LOT 17-SEGPP	233 000,10	ELECTRICITE			
			LOT 17-SEGPP	50 000,00	ELECTRICITE			
			LOT 15-16-BML	221 548,80	CVC.PLOMB.			
			LOT 15-16-BML	97 451,20	CVC.PLOMB.			
			LOT 18-AFEO	73 890,00	ASCENSEURS			

Bordereau de transmission

PLAI

Tableau récapitulatif des commandes (valeur HT restante) - 10 avril 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	Montant HT	Valeur HT restante	Société	Montant HT	Valeur HT restante	Société	Montant HT	Valeur HT restante
SAOMA	152 500,00	34 500,00	AJM	2 600,00	0,00	LEGRAND	18 850,00	0,00
ROM	100 000,00	25 000,00	PROBATI IDF	1 585,00	0,00	AMPB (BECHET)	7 080,00	0,00
ITMR	44 250,00	31 250,00	SASU HVENTIL	600,00	0,00	LS CONSEILS	9 945,00	600,00
BUREAU VERITAS	3 110,00	0,00	BALAS	475,00	475,00	ATB (BECHET)	480,00	0,00
OPTIMUM	36 000,00	8 600,00	LOT 00-01-02-05-KAP	677 160,00	677 160,00	VENEZIA	624,74	0,00
GAIDF	17 000,00	0,00	LOT 02-05-KAP	352 912,02	349 082,02	AJM	650,00	0,00
LS CONSEILS	9 950,00	6 965,00	LOT 03-04-06-07-08-SMART DESIGN	322 500,00	322 500,00	VENEZIA	628,20	0,00
ARCOS	110 000,00	94 050,00	LOT 04-06-07-08-SMART DESIGN	119 800,00	119 800,00	LEGRAND	3 000,00	0,00
GENERAL ACOUSTICS	7 740,00	2 790,00	LOT 09-10-11-12-13-ISOSPACE	458 401,47	458 401,47	AJM	690,00	0,00
VISORI	12 800,00	8 960,00	LOT 09-10-11-12-13-ISOSPACE	158 412,88	158 412,88	ORANGE	495,00	495,00
			LOT 17-SEGPP	233 000,10	233 000,10			
			LOT 17-SEGPP	50 000,00	50 000,00			
			LOT 15-16-BML	221 548,80	221 548,80			
			LOT 15-16-BML	97 451,20	97 451,20			
			LOT 18-AFEO	73 890,00	73 890,00			

PLAI

Tableau récapitulatif des commandes (% d'avancement) - 10 avril 26

Honoraires		
Société	**Montant HT**	**% D'avancement**
SAOMA	152 500,00	77%
ROM	100 000,00	75%
ITMR	44 250,00	29%
BUREAU VERITAS	3 110,00	100%
OPTIMUM	36 000,00	76%
GAIDF	17 000,00	100%
LS CONSEILS	9 950,00	30%
ARCOS	110 000,00	15%
GENERAL ACOUSTICS	7 740,00	64%
VISORI	12 800,00	30%

Travaux		
Société	**Montant HT**	**% D'avancement**
AJM	2 600,00	100%
PROBATI IDF	1 585,00	100%
SASU HVENTIL	600,00	100%
BALAS	475,00	0%
LOT 00-01-02-05-KAP	677 160,00	0%
LOT 02-05-KAP	352 912,02	1%
LOT 03-04-06-07-08-SMART DESIGN	322 500,00	0%
LOT 04-06-07-08-SMART DESIGN	119 800,00	0%
LOT 09-10-11-12-13-ISOSPACE	458 401,47	0%
LOT 09-10-11-12-13-ISOSPACE	158 412,88	0%
LOT 17-SEGPP	233 000,10	0%
LOT 17-SEGPP	50 000,00	0%
LOT 15-16-BML	221 548,80	0%
LOT 15-16-BML	97 451,20	0%
LOT 18-AFEO	73 890,00	0%

Divers		
Société	**Montant HT**	**% D'avancement**
LEGRAND	18 850,00	100%
AMPB (BECHET)	7 080,00	100%
LS CONSEILS	9 945,00	94%
ATB (BECHET)	480,00	100%
VENEZIA	624,74	100%
AJM	650,00	100%
VENEZIA	628,20	100%
LEGRAND	3 000,00	100%
AJM	690,00	100%
ORANGE	495,00	0%

PLAI

Liste des factures - 10 avril 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
02/07/2023	2023-027	SAOMA	01/08/2023	12 750,00	15 300,00	0%	8%	77%
26/10/2023	2023-035	SAOMA	30/10/2023	8 850,00	10 620,00	0%	6%	77%
25/10/2023	2023/125	ROM	30/10/2023	15 000,00	18 000,00	0%	15%	75%
04/08/2023	67358	LEGRAND	30/10/2023	14 650,00	17 580,00	0%	78%	100%
27/10/2023	67794	LEGRAND	22/12/2023	2 000,00	2 400,00	0%	11%	100%
21/12/2023	2023-047	SAOMA	22/12/2023	14 100,00	16 920,00	0%	9%	77%
21/12/2023	2023-051 (5)	SAOMA	22/12/2023	7 000,00	8 400,00	0%	5%	77%
15/12/2023	68061	LEGRAND	22/12/2023	2 200,00	2 640,00	0%	12%	100%
25/12/2023	2023/167	ROM	22/12/2023	10 000,00	12 000,00	0%	10%	75%
18/01/2024	FACTURE N° 06409	GAIDF	15/02/2024	3 750,00	4 500,00	0%	22%	100%
25/01/2024	5581	OPTIMUM	15/02/2024	2 800,00	3 360,00	0%	8%	76%
25/01/2024	2024/014	ROM	15/02/2024	5 000,00	6 000,00	0%	5%	75%
21/12/2023	2023-051 (7)	SAOMA	11/03/2024	8 300,00	9 960,00	0%	5%	77%
25/02/2024	2024-005	SAOMA	11/03/2024	9 500,00	11 400,00	0%	6%	77%
25/02/2024	2024-006	SAOMA	11/03/2024	6 750,00	8 100,00	0%	4%	77%
22/12/2023	FA – 00578	ITMR	11/03/2024	2 000,00	2 400,00	0%	5%	29%
19/03/2024	6537	GAIDF	08/04/2024	7 335,00	8 802,00	0%	43%	100%
29/03/2024	FA – 00594	ITMR	08/04/2024	4 000,00	4 800,00	0%	9%	29%
29/03/2024	FA – 00593	ITMR	08/04/2024	2 500,00	3 000,00	0%	6%	29%
08/04/2024	2024-015	SAOMA	17/04/2024	1 650,00	1 980,00	0%	1%	77%
08/04/2024	2024-014	SAOMA	17/04/2024	18 550,00	22 260,00	0%	12%	77%
25/03/2024	NH / 2024 / 041	ROM	17/04/2024	10 000,00	12 000,00	0%	10%	75%
16/04/2024	5736	OPTIMUM	17/04/2024	7 000,00	8 400,00	0%	19%	76%
16/04/2024	29042024	AJM	02/05/2024	1 400,00	1 540,00	0%	54%	100%
02/05/2024	2052024	AJM	02/05/2024	1 200,00	1 320,00	0%	46%	100%
30/05/2024	527504	VENEZIA	30/05/2024	207,67	249,20	0%	33%	100%
21/05/2024	N°18/05/24	ATB (BECHET)	06/06/2024	480,00	528,00	0%	100%	100%
25/05/2024	NH / 2024 / 045	ROM	06/06/2024	10 000,00	12 000,00	0%	10%	75%
13/03/2024	2024 - 15	AMPB (BECHET)	03/07/2024	4 580,00	5 496,00	0%	65%	100%
20/06/2024	2024-029	SAOMA	03/07/2024	1 200,00	1 440,00	0%	1%	77%
20/06/2024	2024-030	SAOMA	03/07/2024	2 400,00	2 880,00	0%	2%	77%
07/06/2024	2024 - 26	AMPB (BECHET)	03/07/2024	2 500,00	3 000,00	0%	35%	100%

PLAI

Liste des factures - 10 avril 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
24/06/2024	024-006-017	LS CONSEILS	03/07/2024	6 978,00	8 373,60	0%	70%	94%
22/07/2024	533958	VENEZIA	02/08/2024	207,67	249,20	0%	33%	100%
25/07/2024	NH / 2024 / 100	ROM	02/08/2024	10 000,00	12 000,00	0%	10%	75%
06/08/2024	535761	VENEZIA	12/09/2024	209,40	251,28	0%	34%	100%
26/07/2024	2024-032	SAOMA	23/09/2024	2 950,00	3 540,00	0%	2%	77%
26/07/2024	2024-33	SAOMA	23/09/2024	1 550,00	1 860,00	0%	1%	77%
26/07/2024	2024-035	SAOMA	23/09/2024	2 750,00	3 300,00	0%	2%	77%
26/07/2024	2024-036	SAOMA	23/09/2024	4 500,00	5 400,00	0%	3%	77%
12/08/2024	FAC000525	PROBATI IDF	10/10/2024	1 585,00	1 743,50	0%	100%	100%
25/09/2024	NH / 2024 / 124	ROM	10/10/2024	5 000,00	6 000,00	0%	5%	75%
30/09/2024	FA 00645	ITMR	10/10/2024	4 500,00	5 400,00	0%	10%	29%
27/09/2024	024-009-018	LS CONSEILS	10/10/2024	2 985,00	3 582,00	0%	30%	30%
23/09/2024	6004	OPTIMUM	10/10/2024	8 200,00	9 840,00	0%	23%	76%
03/10/2024	FA00504	SASU HVENTIL	10/10/2024	600,00	660,00	0%	100%	100%
23/08/2024	24104117	BUREAU VERITAS	21/10/2024	1 310,00	1 572,00	0%	42%	100%
07/11/2024	24139101	BUREAU VERITAS	18/11/2024	1 800,00	2 160,00	0%	58%	100%
25/11/2024	NH / 2024 / 158	ROM	12/12/2024	10 000,00	12 000,00	0%	10%	75%
26/11/2024	94	AJM	12/12/2024	650,00	715,00	0%	100%	100%
25/11/2024	2024-055	SAOMA	12/12/2024	5 200,00	6 240,00	0%	3%	77%
21/11/2024	6122	OPTIMUM	12/12/2024	2 800,00	3 360,00	0%	8%	76%
18/12/2024	6227	OPTIMUM	09/01/2025	6 600,00	7 920,00	0%	18%	76%
12/12/2024	552927	VENEZIA	09/01/2025	209,40	251,28	0%	33%	100%
28/01/2025	F-2025-5	SAOMA	28/01/2025	4 500,00	5 400,00	0%	3%	77%
28/01/2025	F-2025-6	SAOMA	28/01/2025	500,00	600,00	0%	0%	77%
28/01/2025	F-2025-7	SAOMA	28/01/2025	1 100,00	1 320,00	0%	1%	77%
03/02/2025	F-2025-11	SAOMA	03/02/2025	3 000,00	3 600,00	0%	2%	77%
14/11/2024	546568	VENEZIA	10/02/2025	209,40	251,28	0%	33%	100%
13/01/2025	553916	VENEZIA	10/02/2025	209,40	251,28	0%	33%	100%
20/04/2025	70489	LEGRAND	13/05/2025	3 000,00	3 600,00	0%	100%	100%
28/01/2025	F-2025-4	SAOMA	13/05/2025	900,00	1 080,00	0%	1%	77%
02/07/2025	8644	GENERAL ACOUSTICS	10/07/2025	620,00	744,00	0%	8%	64%
30/06/2025	2025-0502	VISORI	10/07/2025	1 152,00	1 382,40	0%	9%	30%

PLAI

Liste des factures - 10 avril 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
24/06/2025	F250624225VDS	ARCOS	10/07/2025	4 250,00	5 100,00	0%	4%	15%
24/06/2025	F250624226VDS	ARCOS	10/07/2025	1 250,00	1 500,00	0%	1%	15%
22/07/2025	2025-07-020	LOT 02-05-KAP	30/07/2025	3 830,00	4 596,00	0%	1%	1%
29/07/2025	F250729238VDS	ARCOS	30/07/2025	1 125,00	1 350,00	0%	1%	15%
29/07/2025	F250729239VDS	ARCOS	30/07/2025	3 825,00	4 590,00	0%	3%	15%
30/07/2025	8675	GENERAL ACOUSTICS	30/07/2025	1 830,00	2 196,00	0%	24%	64%
30/06/2025	2025-0503	VISORI	09/09/2025	2 688,00	3 225,60	0%	21%	30%
18/08/2025	8686	GENERAL ACOUSTICS	09/09/2025	2 500,00	3 000,00	0%	32%	64%
14/09/2025	14092025	AJM	09/10/2025	440,00	528,00	0%	64%	100%
08/09/2025	0076/2025	AJM	09/10/2025	250,00	300,00	0%	36%	100%
09/10/2025	7493	GAIDF	10/11/2025	3 330,00	3 996,00	0%	20%	100%
09/10/2025	7494	GAIDF	10/11/2025	1 170,00	1 404,00	0%	7%	100%
09/10/2025	7496	GAIDF	10/11/2025	0,00	0,00	0%	0%	100%
13/10/2025	025-010-001	LS CONSEILS	10/11/2025	2 367,00	2 840,40	0%	24%	94%
10/11/2025	7553	GAIDF	10/11/2025	1 415,00	1 698,00	0%	8%	100%
26/11/2025	F251126287VDS	ARCOS	12/12/2025	1 250,00	1 500,00	0%	1%	15%
26/11/2025	F251126288VDS	ARCOS	12/12/2025	4 250,00	5 100,00	0%	4%	15%
